

**SITUAZIONE LAVORI E RAPPRESENTAZIONE
IMPORTI IMPEGNATI E PAGATI DA
PROGRAMMI DI SPESA**

BILANCIO 2002

Allegato

Riepilogo Categoria XII

Grafici avanzamento lavori

Elenco lavori:

Accordo di programma 1996

Accordo di programma 1997

Accordo di programma 1998

Accordo di programma 1999 Elenco A

Accordo di programma 1999 Elenco B

Accordo di programma 2000

Accordo di programma 2001

Accordo di programma 2002

Alluvione novembre 1994

Articolo 2


Legge Roma Capitale

Alluvione Magistrato del Po

Finanziamenti CIPE

Riepilogo Residui passivi Categoria XII " Lavori "

	Totale residuo "C" al 31-dic-2001	Totale impegnato Esercizio 2002	Totale Pagato Esercizio 2002	Totale residuo "C" al 18-dic-2002	n° Lavori con residuo al 18/12/2002	% Avanzament o Fisico
- Accordi di programma						
Anno 1996	417.147.919	-9.338.049	98.746.260	309.063.610	30	57,0%
Anno 1997	275.850.918	63.405.588	130.311.665	208.944.841	32	79,2%
Anno 1998	292.209.593	-33.296.663	39.182.497	219.730.434	13	33,7%
Anno 1999 Elenco A	488.206.119	27.346.326	134.194.495	381.357.950	48	67,0%
Anno 1999 Elenco B	617.974.776	-1.282.024	99.028.717	517.664.035	33	40,3%
Anno 2000	1.214.141.613	-113.944.321	40.027.445	1.060.169.847	57	3,8%
Anno 2001	141.452.253	196.278.082	1.465.181	336.265.154	18	1,2%
Anno 2002	0	331.957.265	656.554	331.300.711	12	0,0%
- Alluvione Novembre '94	40.968.894	2.562.211	13.094.969	30.436.135	6	36,1%
- Articolo 2 legge 662/96	436.202.948	12.495.251	188.403.237	260.294.962	38	89,1%
- "Roma Capitale"	6.860.745	-739.695	2.383.494	3.737.556	3	100,0%
- "Magistrato del Po"	25.857.967	0	1.535.973	24.321.995	2	16,1%
- CIPE	930.947.477	33.727.683	241.892.591	722.782.568	26	42,4%
Sommano liste	4.887.821.221	509.171.655	990.923.077	4.406.069.799	318	
					n.classifiche	
- Altri lavori dal 1996/2001	1.336.922.693	1.504.837.522	193.958.747	2.647.801.468	342	
- Lavori ante 96	711.404.004	31.584.734	187.609.886	555.378.853	293	
Sommano lavori	6.936.147.918	2.045.593.911	1.372.491.710	7.609.250.120	953	
- Classifiche varie (macchinari, informatica,....)	114.256.528	256.877.435	270.362.274	100.771.689	238	
- Manutenzione ed attività decentrata di cui scaduti	523.306.005	508.523.611	590.907.095	440.922.521	22.196	
				-(34.200)		
Totale Categoria XII - "Lavori"	7.573.710.451	2.010.994.957	2.233.761.079	8.150.910.129	23.387	
Residui di Stanziamento di Lettera "F" per Categoria XII - "Lavori"				3.742.714.944		
Altre categorie - Residui di Lettera "C" (impegni)				108.847.691		
Altre categorie - Residui di Lettera "F" (stanziamenti)				207.913.581		
				<u>12.210.386.345</u>		

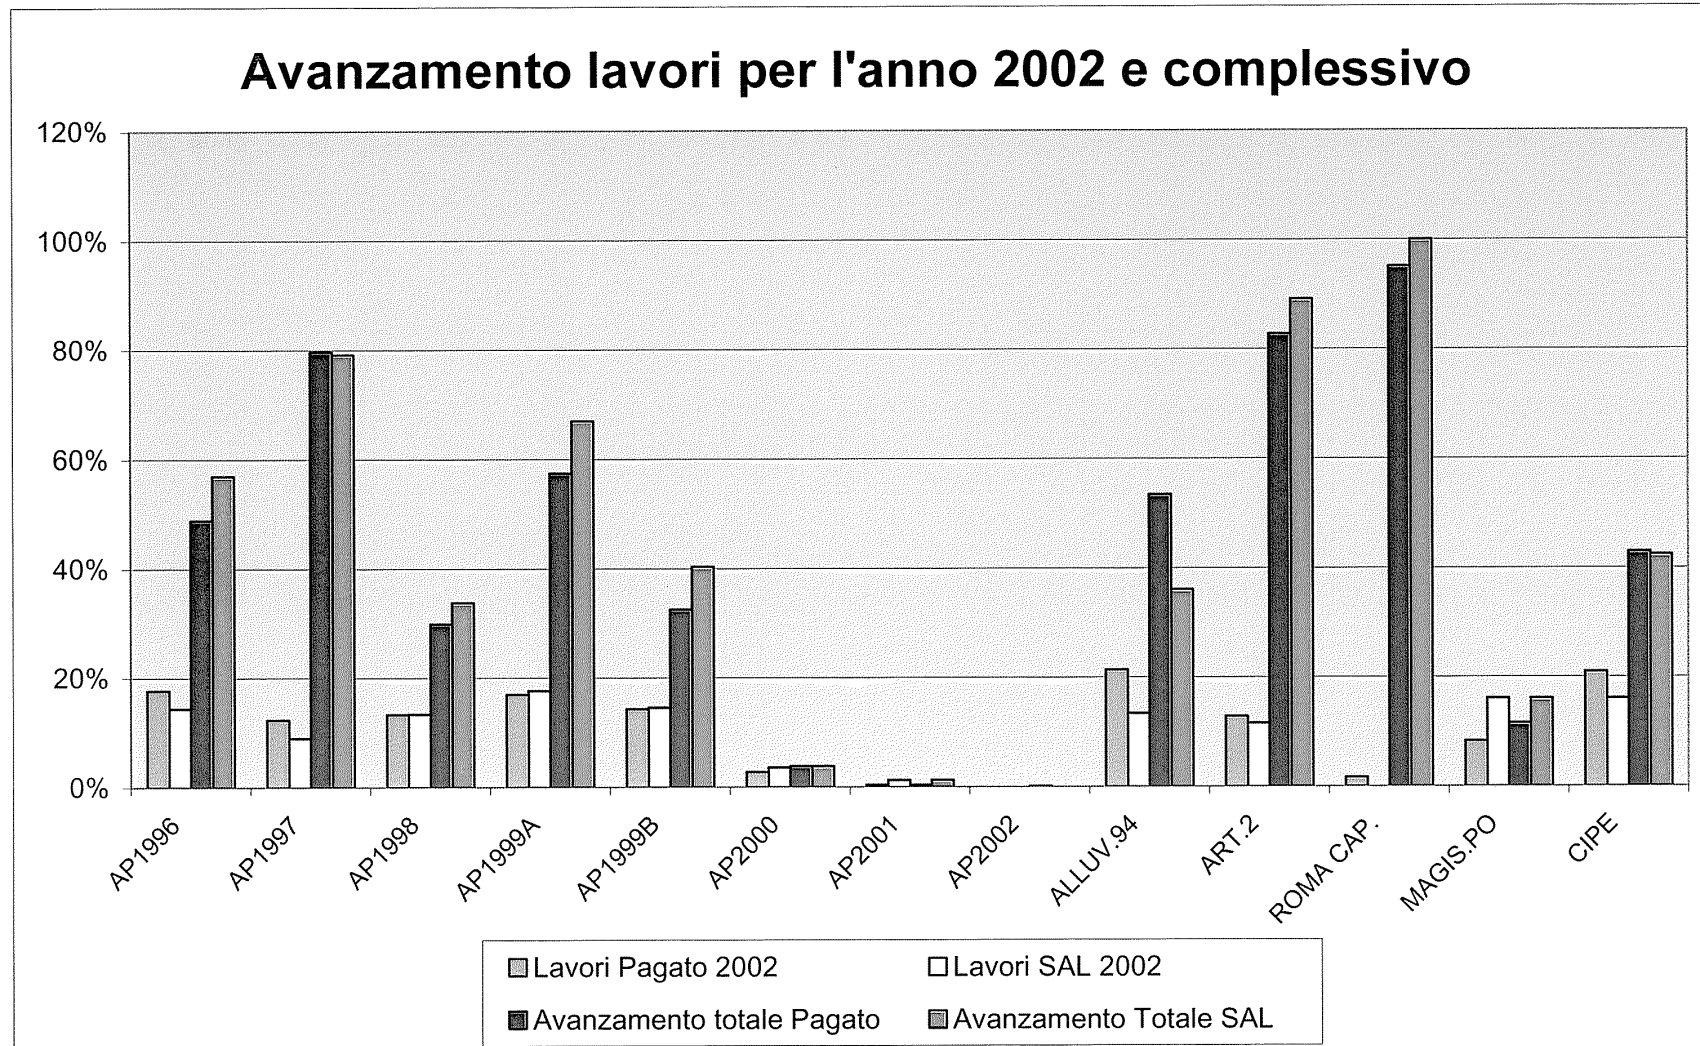

Accordo di Programma 1996											
Per AREA	Esercizio 2002						TOTALI				
	Totale Residuo C al 31-dic-2001	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 18-dic-2002	Lavori Principali Avanzamento Pagato Fisico	Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.	%Fisico
						Stato dei Lavori Principali					
TOTALI Area	Centro	128.599.327	Comp 3.283.703 Res. 10.957.223	265.604 51.593.225	90.981.423	20,7% 18,6%	273.419.452	17.367.447	165.070.582	60,4%	72,2%
TOTALI Area	Nord	134.729.151	Comp 1.510.358 Res. -11.590.349	782.038 26.457.972	97.409.150	20,3% 13,9%	170.593.239	0	73.184.089	42,9%	54,5%
TOTALI Area	Sud	153.819.441	Comp 6.609.251 Res. -20.108.234	1.974.357 17.673.064	120.673.037	11,4% 9,7%	193.938.241	0	73.265.204	37,8%	40,8%
TOTALI COMPLESSIVI	Accordo di Programma 1996	417.147.919	Comp 11.403.311 Res. -20.741.360	3.021.999 95.724.261	309.063.610	17,7% 14,3%	637.950.931	17.367.447	311.519.875	48,8%	57,0%

Accordo di Programma 1996												
LAVORO		Esercizio 2002						TOTALI				
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2001	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 18-dic-2002	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.
							Pagato	Fisico	Stato dei Lavori Principali			%Fisico
1	RACCORDO AUTOSTRADALE TOLENTINO CIVITANOVA MARCHE (AN 709 00323) RACCORDO AUTOSTRADALE TOLENTINO - CIVITANOVA MARCHE. LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO SVINCOLO NEI PRESSI DELLA ZONA INDUSTRIALE	413.166	Comp	325.427	265.604	59.823	0,0%	0,0%	2.316.347	0	2.256.525	97,4%
			Res.	0	413.166				Lavoro principale ultimato			100,0%
2	S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) (AN 709 00324) E78-GROSSETO-FANO - TRONCO: SELCI - MERCATELLO SUL METAURO - LOTTO 2° - COMPLETAMENTO VIA SX GALLERIA "GUINZA" E RELATIVI COLLE.TI VIAB .ESISTENTE-OPERE SOTTERRANEE E RACC.VIAB.ES	39.078.510	Comp	600	0	29.601.736	14,7%	21,5%	66.109.236	17.367.447	19.140.054	29,0%
			Res.	0	9.477.374				Lavoro principale in corso			41,7%
3	SS.N.27 DEL GRAN SAN BERNARDO (AO 727 00180) SS 27 - LAVORI DI SISTEMAZIONE E STRAORDINARIA MANUTENZIONE TRA ETROUBLES E L'INNESTO PER IL TRAFORO DEL GRAN SAN BERNARDO	3.497.206	Comp	0	0	2.683.726	15,9%	0,0%	5.152.006	0	2.468.279	47,9%
			Res.	0	813.480				Lavoro principale sospeso			46,2%
4	SS.N.260 PICENTE (AQ 709 00349) SS 260 - LAVORI COSTRUZIONE VARIANTE PIZZOLI FINO AL BIVIO (CAGNANO - LOTTO 2°.	6.924.832	Comp	1.484.555	0	5.841.821	33,2%	32,7%	11.730.285	0	5.888.464	50,2%
			Res.	-83	2.567.482				Lavoro principale in corso			73,1%
5	SS.N.16 ADRIATICA (AQ 709 00356) SS 16 - LAVORI URGENTI ALLARGAMENTO PONTE A 19 CAMPATE SUL FIUME VOMANO UBICATO ALLA PROGR.VA KM.CA 421+700	2.640	Comp	0	0	0	0,0%	0,0%	1.177.214	0	1.177.214	100,0%
			Res.	-2.640	0				Lavoro principale ultimato			100,0%
6	SS.N.17 DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO-SANNITICO (AQ 709 00369) SS 17- LAVORI NECESSARI A GARANTIRE SICUREZZA CIRCOLAZINE SU NUOVO TRATTO STRADALE "VARIANTE DI SULMONA" TRA I KM 93+800E 99+600	0	Comp	0	0	0	0,0%	0,0%	2.091.739	0	2.091.739	100,0%
			Res.	0	0				Lavoro principale ultimato			100,0%
7	SS.N.580 DI GINOSA (BA 709 00547) SS 580 -"DI GINOSA"-LAVORI NORMALIZZAZIONE SEZIONE STRADALE AL TIPO IV DELLE NORME CNR DAL KM 11+232 AL KM 24+142	9.265.219	Comp	0	0	3.435.780	77,0%	62,9%	10.649.213	0	7.213.433	67,7%
			Res.	0	5.829.439				Lavoro principale sospeso			90,6%

Accordo di Programma 1996												
LAVORO		Esercizio 2002						TOTALI				
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2001	C	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 18-dic-2002	Lavori Principali Avanzamento	Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.	
			R				Pagato Fisco	Stato dei Lavori Principali		%Fisico		
8	SS.N.468 DI CORREGGIO (BO 709 00580) SS 468-LAVORI DI COSTRUZIONE TANGENZIALE NORD FINALE EMILIA VARIANTE DELLA SS 468 DAL KM 66+000 AL KM 72+000 - 1° STRALCIO DELL'ESTESA KM 2+250 TRA IL KM 72+000 E LA S.C. ROVERE	7.586.195	Comp	728.319	0	6.604.754	24,8%	24,2%	9.810.026	0	3.205.272	32,7%
			Res.	0	1.709.760				Lavoro principale in corso		65,3%	
9	SS.N.12 DELL'ABETONE E DEL BRENNERO (BO 709 00581) SS 12 - LAVORI COSTRUZIONE VARIANTE MIRANDOLA TRA I KM 209+505 E 220+175 - LOTTO 1° DAL KM 209+505 AL KM 217+000.=	12.199.158	Comp	0	0	9.485.145	25,0%	27,8%	15.473.713	0	5.988.568	38,7%
			Res.	0	2.714.014				Lavoro principale in corso		50,3%	
10	S.G.C. ORTE - RAVENNA (E45) (BO 709 00585) SGC E/45-"ORTE-RAVENNA"-LAVORI PER ADEGUAMENTO LIVELLO DI SERVIZIO NEL TRONCO SARSINA - BORELLO TRA I KM 196+000 E 212+000 - LOTTO V	23.498.789	Comp	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0,0%
			Res.	-23.498.789	0				OGGETTO ATTUALMENTE SI TROVA PRESSO COMPARTIME		0,0%	
11	SS.N.310 DEL BIDENTE (BO 709 00586) SS 310 - LAVORI COSTRUZIONE VARIANTE ELIMINAZIONE VIZIOSITA' PLANIMETRICHE TRA I KM 61+680 E 63+400 IN LOCALITA' TOMBINA=	1.278.760	Comp	0	0	1.192.877	0,0%	0,0%	2.508.685	0	1.315.808	52,5%
			Res.	0	85.883						57,3%	
12	SS.N.64 PORRETTANA (BO 709 00589) SS 64-LAV.COSTR.VAR.TE ALLA STATALE-TRONCO 1°.DAL KM 0+000 ALL'INCROCIO CON VIA BAZZABESE E COLLEGAMENTO CON LA NUOVA .VIA UGO BASSI=	1.511.290	Comp	0	0	22.365	29,6%	0,0%	5.099.293	0	5.076.928	99,6%
			Res.	-164.295	1.324.630				Lavoro principale ultimato		100,0%	
13	SS.N.310 DEL BIDENTE (BO 709 00590) SS 310-LAVORI COSTRUZIONE VARIANTE TRA I KM 57+600 E 59+900 IN CORRISPONDENZA DEL RIO SUASIA=	1.565.551	Comp	0	0	1.794.175	0,0%	0,0%	3.633.041	0	1.838.866	50,6%
			Res.	313.879	85.255						64,1%	
14	SS.N.495 DI CODIGORO (BO 709 00595) SS 495 - LAVORI COSTRUZIONE VARIANTE ALLA STATALE TRA I KM. 20+550 E 22+750 IN CORRISPONDENZA DI MIGLIARINO=	5.083.004	Comp	0	0	3.160.121	45,4%	53,3%	6.333.620	0	3.173.499	50,1%
			Res.	0	1.922.883						81,7%	

Accordo di Programma 1996												
LAVORO		Esercizio 2002					TOTALI					
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2001	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 18-dic-2002	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.
							Pagato	Fisico	Stato dei Lavori Principali		%Fisico	
15	ASSE VIARIO CISPADANO (BO 709 00598) ASSE VIARIO CISPADANO - LOTTO 2° DAL KM 7+500 AL KM 16+700 -1° STRALCIO DAL KM 13+000 AL KM 16+700	9.415.598	Comp Res.	0 1.912.521	0 620.968	10.707.152	3,7%	15,2%	17.775.702	0	7.068.550	39,8%
									Lavoro principale in corso		51,4%	
16	SS.N.127 SETTENTRIONALE SARDA (CA 709 00464) SS 127 - LAVORI AMMODERNAMENTO E SISTEMAZIONE ITINERARIO SASSARI-TEMPIO-OLBIA - TRATTO TEMPO - OLBIA LOTTO I (STAZIONE AGGIUS-LURAS)	0	Comp Res.	0 520.087	0 520.087	0	100,0%	0,0%	563.143	0	563.143	100,0%
											0,0%	
17	SS.N.127 SETTENTRIONALE SARDA (CA 709 00466) SS 127-LAV.AMM.TO E SIST.NE ITINERARIO SASSARI-TEMPIO OLBIA TRATTO: TEMPIO-OLBIA - LOTTO 5° (MONTE PINU-OLBIA) - PROGETTO REDATTO DA LIBERO PROFESSIONISTA SU INCARICO AMM.NE PROV.SS	0	Comp Res.	0 1.939.812	0 1.939.812	0	100,0%	0,0%	1.967.575	0	1.967.575	100,0%
											0,0%	
18	SS.N.125 ORIENTALE SARDA (CA 801 00291) SS 125- LAVORI COSTR.NE NUOVA SS 125 - TRONCO TERTENIA - S.PRIAMO LOTTO 4°-STRALCIO 2° (MURAVERA-S.PRIAMO).	20.369.048	Comp Res.	0 0	0 5.636.006	14.733.041	24,1%	19,8%	25.276.012	0	10.542.971	41,7%
									Lavoro principale in corso		43,9%	
19	SS.N.283 DELLE TERME LUGIGIANE (CZ 709 00441) SS 283 -PROG.ESEC.VO COSTRUZ. 3° TRONCO STRADA DELLE TERME DA INNESTO CON SS 533 (S.MARCO ARGENTANO) ALLO SVINCOLO SPEZZANO T. AUT./SA-RC-LOTTO 1°	5.109.865	Comp Res.	6.609.251 0	1.974.357 50.784	9.693.975	12,3%	11,3%	21.440.035	0	11.746.059	54,8%
									Lavoro principale sospeso		73,3%	
20	SS.N.283 DELLE TERME LUGIGIANE (CZ 709 01119) SS 283-LAVORI ADEGUAM.TO 4° E 5° TRONCO STRADA DELLE TERME DALLO SVINC.SPEZZANO ALBANESE AUT.SA-RC A INNESTO CON SS 534 LOTTO 3° KM 46+973 E 5 2+477 =	22.568.134	Comp Res.	0 -22.568.134	0 0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0,0%
											0,0%	
21	SS.N.106 JONICA (CZ 709 01186) SS 106-LAVORI AMMOD.TO E ADEGUAMENTO TRA I KM 393+840 (AMENDOLARA E 410+040 (ROCCA IMPERIALE) 3° LOTTO TRA I KM 403+227 E 405+950-2° STRALCIO-CARREGGIATA DI MONTE	11.848.891	Comp Res.	0 0	0 2.325.415	9.523.476	7,2%	15,1%	39.021.006	0	29.497.530	75,6%
									Lavoro principale ultimato		100,0%	
