

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 180.000.000	L. 170.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 06/08/98	L. 180.000.000	L. 170.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 20/11/98	L. 180.000.000	L. 170.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 27/01/99	L. 180.000.000	L. 170.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 09/02/99	L. 180.000.000	L. 170.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 01/06/99	L. 180.000.000	L. 170.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 05/08/99	L. 180.000.000	L. 170.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 13/09/99	L. 180.000.000	L. 170.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 16/11/99	L. 180.000.000	L. 170.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
Automatico	L. 180.000.000	L. 170.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 21/07/00	L. 180.000.000	L. 170.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 01/08/00	L. 180.000.000	L. 170.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 14/12/00	L. 180.000.000	L. 170.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 14/02/01	L. 158.322.000	L. 148.322.000	L. 0	L. 10.000.000	- Lit. -21678000

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (01/02/00)	
Opere Civili	120.000.000	118.000.000	
Opere Impiantistiche			
Arredi e/o Attrezzature			
Altre Voci			
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>120.000.000</b>	<b>118.000.000</b>	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Progettazione	6.000.000	6.000.000	
Altre Spese Tecniche	12.000.000	12.000.000	
Allacciamenti			
Imprevisti	12.000.000	5.900.000	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili	10.000.000		
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	13.000.000	12.390.000	
IVA al 20%	7.000.000	4.032.000	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>60.000.000</b>	<b>40.322.000</b>	
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>180.000.000</b>	<b>158.322.000</b>	
	<b>Economie</b>	<b>-21.678.000</b>	
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>	
Finanziamento ex 270/97	170.000.000	148.322.000	
Risorse proprie	10.000.000	10.000.000	
Altre fonti finanziarie			
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>180.000.000</b>	<b>158.322.000</b>	

Protocollo d'intervento: **558****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE EX CONVENTO SAN FRANCESCO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN OSTELLO*

Comune **BAGNACAVALLO (RA)**

Finanziamento **L. 5.617 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 5.616.176.500**

- Tot. Pagato **L. 5.616.176.501**

Cofinanziamento **L. 1.000 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	22/07/98	22/07/98
Fine Lavori	28/09/98	30/10/99

*Ex Convento di S. Francesco***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI BAGNACAVALLO**

Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**

C.Fis./P.IVA **00257850396**

Indirizzo **PIAZZA LIBERTA', 12** **BAGNACAVALLO (RA)**

Recapiti **Telefono: 0545 61127** **Telefax: 0545 63747**

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
PUBBLICO INCANTO ART.21 L.109/94 PREZZI UNITARI	CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI  VIA DELLA COOPERAZIONE 30 40129 BOLOGNA 00281620377	L. 5.277.375.956	L. 5.052.559.639	4,26
		<b>Totali</b>	<b>L. 5.277.375.956</b>	<b>L. 5.052.559.639</b>

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

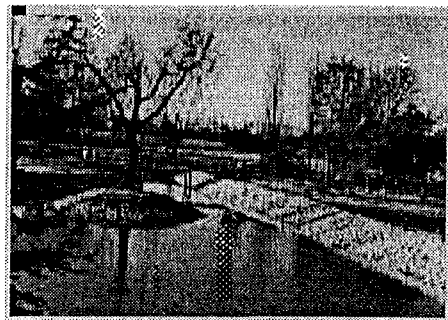
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 6.600.000.000	L. 5.600.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 06/08/98	L. 6.600.000.000	L. 5.600.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 20/11/98	L. 6.600.000.000	L. 5.600.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 27/01/99	L. 6.600.000.000	L. 5.600.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 09/02/99	L. 6.600.000.000	L. 5.600.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 01/06/99	L. 6.346.820.000	L. 5.346.820.000	L. 0	L. 1.000.000.000	Lit. -253180000
DM 05/08/99	L. 6.346.820.000	L. 5.346.820.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 13/09/99	L. 6.346.820.000	L. 5.346.820.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 16/11/99	L. 6.346.820.000	L. 5.346.820.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
Automatico	L. 6.616.756.653	L. 5.616.756.653	L. 0	L. 1.000.000.000	+ Lit. 269936653
DM 21/07/00	L. 6.616.756.653	L. 5.616.756.653	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 01/08/00	L. 6.616.756.653	L. 5.616.756.653	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 14/12/00	L. 6.616.756.653	L. 5.616.756.653	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 14/02/01	L. 6.616.756.653	L. 5.616.756.653	L. 0	L. 1.000.000.000	

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (10/09/01)
Opere Civili	4.394.000.000	4.269.660.000
Opere Impiantistiche	883.000.000	782.880.000
Arredi e/o Attrezzature	333.000.000	333.000.000
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>5.610.000.000</b>	<b>5.385.540.000</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	192.000.000	192.000.000
Altre Spese Tecniche	104.000.000	104.000.000
Allacciamenti	23.000.000	13.500.000
Imprevisti	11.000.000	8.400.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	7.000.000	12.120.000
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	527.000.000	505.260.000
IVA al 20%	126.000.000	126.000.000
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>990.000.000</b>	<b>961.280.000</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>6.600.000.000</b>	<b>6.346.820.000</b>
	Economie	-253.180.000
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	5.600.000.000	5.346.820.000
Risorse proprie	1.000.000.000	1.000.000.000
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>6.600.000.000</b>	<b>6.346.820.000</b>

Protocollo d'intervento: **951****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *IL RECUPERO AMBIENTALE DEL COMPLESSO ABBAZIA DI POMPOSA*  
 Comune **CODIGORO (FE)**  
 Finanziamento **L. 444 milioni**  
 - Tot. Impegnato **L. 413.045.978**  
 - Tot. Pagato **L. 413.045.978**  
 Cofinanziamento **L. 116 milioni**

*Abbazia di Pomposa***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI CODIGORO**  
 Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**  
 C.Fis./P.IVA **00339040388**  
 Indirizzo **PIAZZA MATTEOTTI, 60** **CODIGORO (FE)**  
 Recapiti **Telefono: 0533 729111** **Telefax: 0533 729248**

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
ASTA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO	CONS. "CIRO MENOTTI" VIA RIVA DI RENO 47 40122 BOLOGNA 00966060378	L. 460.000.000	L. 411.697.410	10,50
<b>Totali</b>		<b>L. 460.000.000</b>	<b>L. 411.697.410</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 580.000.000	L. 464.000.000	L. 0	L. 116.000.000	
DM 06/08/98	L. 580.000.000	L. 464.000.000	L. 0	L. 116.000.000	
DM 20/11/98	L. 580.000.000	L. 464.000.000	L. 0	L. 116.000.000	
DM 27/01/99	L. 580.000.000	L. 464.000.000	L. 0	L. 116.000.000	
DM 09/02/99	L. 580.000.000	L. 464.000.000	L. 0	L. 116.000.000	
DM 01/06/99	L. 580.000.000	L. 464.000.000	L. 0	L. 116.000.000	
DM 05/08/99	L. 560.000.000	L. 444.000.000	L. 0	L. 116.000.000	Lit. -20000000
DM 13/09/99	L. 560.000.000	L. 444.000.000	L. 0	L. 116.000.000	
DM 16/11/99	L. 560.000.000	L. 444.000.000	L. 0	L. 116.000.000	
Automatico	L. 560.000.000	L. 444.000.000	L. 0	L. 116.000.000	
DM 21/07/00	L. 560.000.000	L. 444.000.000	L. 0	L. 116.000.000	
DM 01/08/00	L. 560.000.000	L. 444.000.000	L. 0	L. 116.000.000	
DM 14/12/00	L. 560.000.000	L. 444.000.000	L. 0	L. 116.000.000	
DM 14/02/01	L. 560.000.000	L. 444.000.000	L. 0	L. 116.000.000	

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (21/03/01)
Opere Civili	397.800.000	452.781.375
Opere Impiantistiche	32.200.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>430.000.000</b>	<b>452.781.375</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	45.000.000	36.944.111
Altre Spese Tecniche	27.000.000	1.139.375
Allacciamenti		
Imprevisti	26.000.000	2.736.118
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		35.445.001
IVA al 10%	43.000.000	
IVA al 20%	9.000.000	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>150.000.000</b>	<b>76.264.605</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>580.000.000</b>	<b>529.045.980</b>
	Economie	-50.954.020
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>		
	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	444.000.000	413.045.978
Risorse proprie	116.000.000	116.000.000
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>560.000.000</b>	<b>529.045.978</b>

Protocollo d'intervento: **953**

## DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI PARCHEGGI E DELLA VIABILITA' DI RACCORDO A SERVIZIO DI POMPOSA*

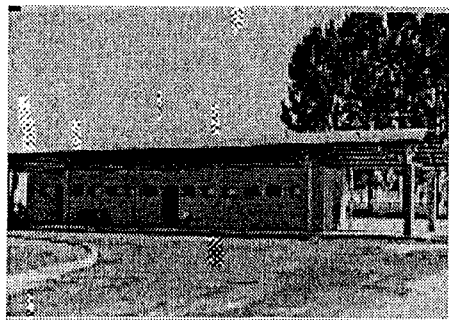
Comune **CODIGORO (FE)**

Finanziamento **L. 3.277 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 3.277.070.845**

- Tot. Pagato **L. 3.277.070.845**

Cofinanziamento **L. 920 milioni**



Abbazia di Pomposa

## DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **COMUNE DI CODIGORO**

Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**

C.Fis./P.IVA **00339040388**

Indirizzo **PIAZZA MATTEOTTI, 60** **CODIGORO (FE)**

Recapiti **Telefono: 0533 729111** **Telefax: 0533 729248**

## DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
ASTA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO	V.I.C.E.S. S.R.L. Vitti Costruzioni Edili Stradali VIA F. CRISPI 99 92026 FAVARA (AG) 01712160843	L. 3.670.000.000	L. 3.233.700.768	11,89
Totali		L. 3.670.000.000	L. 3.233.700.768	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

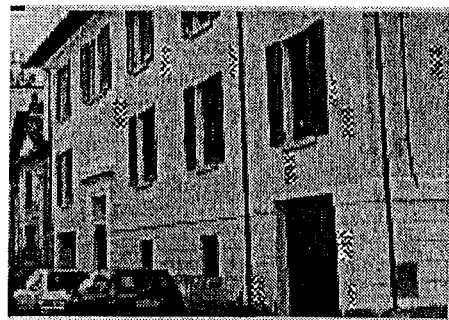
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 4.600.000.000	L. 3.680.000.000	L. 0	L. 920.000.000	
DM 06/08/98	L. 4.600.000.000	L. 3.680.000.000	L. 0	L. 920.000.000	
DM 20/11/98	L. 4.600.000.000	L. 3.680.000.000	L. 0	L. 920.000.000	
DM 27/01/99	L. 4.600.000.000	L. 3.680.000.000	L. 0	L. 920.000.000	
DM 09/02/99	L. 4.197.070.845	L. 3.277.070.845	L. 0	L. 920.000.000	- Lit. -402929155
DM 01/06/99	L. 4.197.070.845	L. 3.277.070.845	L. 0	L. 920.000.000	
DM 05/08/99	L. 4.197.070.845	L. 3.277.070.845	L. 0	L. 920.000.000	
DM 13/09/99	L. 4.197.070.845	L. 3.277.070.845	L. 0	L. 920.000.000	
DM 16/11/99	L. 4.197.070.845	L. 3.277.070.845	L. 0	L. 920.000.000	
Automatico	L. 4.197.070.845	L. 3.277.070.845	L. 0	L. 920.000.000	
DM 21/07/00	L. 4.197.070.845	L. 3.277.070.845	L. 0	L. 920.000.000	
DM 01/08/00	L. 3.396.926.513	L. 2.476.926.513	L. 0	L. 920.000.000	- Lit. -800144332
DM 14/12/00	L. 3.396.926.513	L. 2.476.926.513	L. 0	L. 920.000.000	
DM 14/02/01	L. 4.197.070.845	L. 3.277.070.845	L. 0	L. 920.000.000	+ Lit. 800144332

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (11/10/01)
Opere Civili	3.071.000.000	3.229.799.784
Opere Impiantistiche	529.000.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>3.600.000.000</b>	<b>3.229.799.784</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	330.000.000	298.056.146
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti	30.000.000	72.318.603
Imprevisti	154.000.000	99.224.520
- Espropri o Acquisizioni	60.000.000	285.175.252
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	360.000.000	381.830.728
IVA al 20%	66.000.000	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>1.136.605.249</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>4.600.000.000</b>	<b>4.366.405.033</b>
	Economic	-233.594.967
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	3.680.000.000	3.277.070.845
Risorse proprie	920.000.000	920.000.000
Altre fonti finanziare		169.334.188
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>4.600.000.000</b>	<b>4.366.405.033</b>

Protocollo d'intervento: **1121****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO EX CASERMA CARABINIERI</i>	
Comune	<b>CATTOLICA (RN)</b>	
Finanziamento	L. 1.925 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 1.923.982.248
	- Tot. Pagato	L. 1.731.584.019
Cofinanziamento	L. 1.461 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	20/12/98	23/12/98
Fine Lavori	20/09/99	14/12/99

*Ex caserma dei carabinieri***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	COMUNE DI CATTOLICA	
Categoria	AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)	
C.Fis./P.IVA	00343840401	
Indirizzo	PIAZZA ROOSEVELT, 3	CATTOLICA (RN)
Recapiti	Telefono: 0541 966511	Telefax: 0541 960340

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA AVVISO DI GARA 29/04/1999	Consorzio Artigianali Romagnolo Soc.Coop.ARL.  Via F. Baracca, 16 - 47900 Rimini 01685300400	L. 149.756.000	L. 134.212.044	10,38
LICITAZIONE PRIVATA-AVVISO DI GARA 29/04/1999	Elettromeccanica BI.ELLE S.N.C. di A. Bocchini & C  via Val di Rocco, z.i. 06077 - Ponte Felcino (PG) 01119090544	L. 350.000.000	L. 276.990.000	20,86
LICITAZIONE PRIVATA	CARPENTEDIL COSTRUZIONI S.R.L.  VIA MONTONE 18 47040 CORIANO (RN) 00690190400	L. 1.200.000.000	L. 1.050.600.000	12,45
Totali		L. 1.699.756.000	L. 1.461.802.044	



## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.428.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 1.428.000.000	
DM 06/08/98	L. 3.428.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 1.428.000.000	
DM 20/11/98	L. 3.428.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 1.428.000.000	
DM 27/01/99	L. 3.428.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 1.428.000.000	
DM 09/02/99	L. 3.428.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 1.428.000.000	
DM 01/06/99	L. 3.428.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 1.428.000.000	
DM 05/08/99	L. 3.428.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 1.428.000.000	
DM 13/09/99	L. 3.428.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 1.428.000.000	
DM 16/11/99	L. 3.648.000.000	L. 2.220.000.000	L. 0	L. 1.428.000.000	+ Lit. 220000000
Automatico	L. 3.353.000.000	L. 1.925.000.000	L. 0	L. 1.428.000.000	- Lit. -295000000
DM 21/07/00	L. 3.353.000.000	L. 1.925.000.000	L. 0	L. 1.428.000.000	
DM 01/08/00	L. 3.353.000.000	L. 1.925.000.000	L. 0	L. 1.428.000.000	
DM 14/12/00	L. 3.353.000.000	L. 1.925.000.000	L. 0	L. 1.428.000.000	
DM 14/02/01	L. 3.386.000.000	L. 1.925.000.000	L. 0	L. 1.461.000.000	+ Lit. 33000000

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (08/02/01)
Opere Civili	1.200.000.000	1.250.600.000
Opere Impiantistiche	530.000.000	445.053.563
Arredi e/o Attrezzature	300.000.000	300.000.000
Altre Voci	40.000.000	40.000.000
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>2.070.000.000</b>	<b>2.035.653.563</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	100.000.000	100.416.000
Altre Spese Tecniche	20.000.000	30.000.000
Allacciamenti	11.000.000	
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni	990.000.000	990.000.000
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	177.000.000	170.180.204
IVA al 20%	60.000.000	60.000.000
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>1.358.000.000</b>	<b>1.350.596.204</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>3.428.000.000</b>	<b>3.386.249.767</b>
	<b>Economie</b>	<b>-41.750.233</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	2.000.000.000	1.958.249.767
Risorse proprie	1.428.000.000	1.428.000.000
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>3.428.000.000</b>	<b>3.386.249.767</b>

Protocollo d'intervento: **1292****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *REALIZZAZIONE DELLA SEDE E DELLA FORESTERIA DELLA SCUOLA DI PACE DEL PARCO STORICO DI MONTE SOLE TRAMITE IL RECUPERO DELL'EDIFICIO COLONICO IN LOCALITA' S. MARTINO*

Comune **MARZABOTTO (BO)**

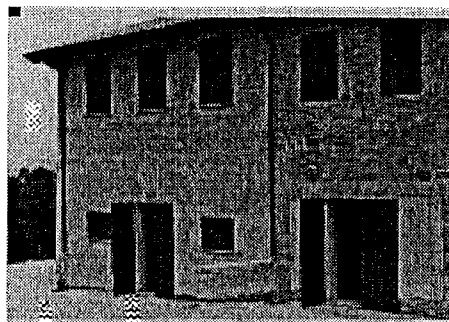
Finanziamento **L. 1.862 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 1.566.713.000**

- Tot. Pagato **L. 783.356.500**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	10/10/98	09/10/98
Fine Lavori	30/09/99	29/10/99



*Edificio colonico all'interno del complesso Poggiolo in località S. Martino*

**DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA**

Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**

C.Fis./P.IVA **80022230371**

Indirizzo **VIA ZAMBONI, 13** **BOLOGNA (BO)**

Recapiti **Telefono: 051 218111** **Telefax: 051 218640**

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
LICITAZIONE PRIVATA	I.C.I. IMPRESA COSTRUZIONI S.R.L. P.ZZA BRUNO MORA 15/A 43100 PARMA 00899620348	L. 1.225.000.000	L. 1.026.427.500	16,21
<b>Totali</b>		<b>L. 1.225.000.000</b>	<b>L. 1.026.427.500</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.100.000.000	L. 2.100.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 2.100.000.000	L. 2.100.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 2.100.000.000	L. 2.100.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 2.100.000.000	L. 2.100.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 2.100.000.000	L. 2.100.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 1.861.713.000	L. 1.861.713.000	L. 0	L. 0	- Lit. -238287000
DM 05/08/99	L. 1.861.713.000	L. 1.861.713.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 1.861.713.000	L. 1.861.713.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 1.861.713.000	L. 1.861.713.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 1.861.713.000	L. 1.861.713.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 1.861.713.000	L. 1.861.713.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 1.861.713.000	L. 1.861.713.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 1.861.713.000	L. 1.861.713.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 1.861.713.000	L. 1.861.713.000	L. 0	L. 0	

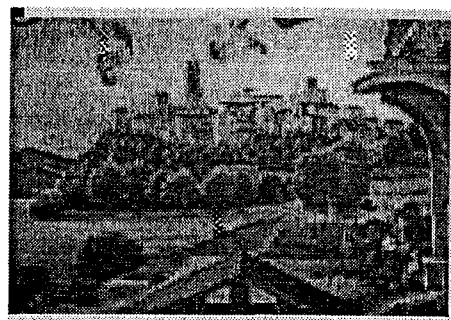
## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (28/04/99)
Opere Civili	975.000.000	1.026.427.500
Opere Impiantistiche	250.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	295.000.000	295.000.000
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>1.520.000.000</b>	<b>1.321.427.500</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche	120.000.000	120.000.000
Allacciamenti	50.000.000	50.000.000
Imprevisti	60.000.000	60.000.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%	350.000.000	310.285.500
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>580.000.000</b>	<b>540.285.500</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>2.100.000.000</b>	<b>1.861.713.000</b>
	Economie	-238.287.000
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	2.100.000.000	1.861.713.000
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>2.100.000.000</b>	<b>1.861.713.000</b>

Protocollo d'intervento: **1368**

## DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *VALORIZZAZIONE TURISTICA DEGLI ITINERARI FRANCIGENI*  
 Comune **PIACENZA (PC)**  
 Finanziamento **L. 454 milioni**  
     - Tot. Impegnato **L. 454.285.620**  
     - Tot. Pagato **L. 454.285.620**  
 Cofinanziamento **L. 245 milioni**  
     Previsione                      Effettiva  
 Inizio Lavori *12/04/99*                      **31/05/99**  
 Fine Lavori *24/09/99*                      **08/11/99**

*Itinerari francigeni*

## DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA**  
 Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**  
 C.Fis./P.IVA **00233540335**  
 Indirizzo **CORSO GARIBALDI, 50** **PIACENZA (PC)**  
 Recapiti **Telefono: 0523 7951** **Telefax: 0523 326376**

## DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	ANASTASIS SOC COOP A R.L. VIA SAN GERVASIO 2 40121 BOLOGNA 03551890373	L. 57.708.333	L. 57.708.333	0,00
TRATTATIVA PRIVATA	NOVI IMPRESA S.R.L. PIAZZA CITTADELLA 30 (MO) 01708550361	L. 71.458.000	L. 71.381.000	0,11
TRATTATIVA PRIVATA	SISE S.R.L. CASTIGLIONE DELLO STIVIERE (MN) 01210380208	L. 131.507.400	L. 131.507.400	0,00
TRATTATIVA PRIVATA	SISE S.R.L. CASTIGLIONE DELLO STIVIERE (MN) 01210380208	L. 142.142.000	L. 142.142.000	0,00
Totali		L. 402.815.733	L. 402.738.733	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 700.000.000	L. 455.000.000	L. 100.000.000	L. 145.000.000	
DM 06/08/98	L. 700.000.000	L. 455.000.000	L. 100.000.000	L. 145.000.000	
DM 20/11/98	L. 700.000.000	L. 455.000.000	L. 100.000.000	L. 145.000.000	
DM 27/01/99	L. 700.000.000	L. 455.000.000	L. 100.000.000	L. 145.000.000	
DM 09/02/99	L. 700.000.000	L. 455.000.000	L. 100.000.000	L. 145.000.000	
DM 01/06/99	L. 700.000.000	L. 455.000.000	L. 100.000.000	L. 145.000.000	
DM 05/08/99	L. 700.000.000	L. 455.000.000	L. 100.000.000	L. 145.000.000	
DM 13/09/99	L. 700.000.000	L. 455.000.000	L. 100.000.000	L. 145.000.000	
DM 16/11/99	L. 700.000.000	L. 455.000.000	L. 100.000.000	L. 145.000.000	
Automatico	L. 700.000.000	L. 455.000.000	L. 100.000.000	L. 145.000.000	
DM 21/07/00	L. 700.000.000	L. 455.000.000	L. 100.000.000	L. 145.000.000	
DM 01/08/00	L. 700.000.000	L. 455.000.000	L. 100.000.000	L. 145.000.000	
DM 14/12/00	L. 700.000.000	L. 455.000.000	L. 100.000.000	L. 145.000.000	
DM 14/02/01	L. 699.285.620	L. 454.285.620	L. 100.000.000	L. 145.000.000	- Lit. -714380

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (17/10/00)	
Opere Civili			
Opere Impiantistiche			
Arredi e/o Attrezzature	423.334.000	422.738.683	
Altre Voci			
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>423.334.000</b>	<b>422.738.683</b>	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Progettazione	60.000.000	79.000.000	
Altre Spese Tecniche	100.000.000	95.666.000	
Allacciamenti			
Imprevisti			
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%			
IVA al 20%	116.666.000	101.880.937	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>276.666.000</b>	<b>276.546.937</b>	
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>700.000.000</b>	<b>699.285.620</b>	
	<b>Economie</b>	<b>-714.380</b>	
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>	
Finanziamento ex 270/97	455.000.000	454.285.620	
Risorse proprie	145.000.000	145.000.000	
Altre fonti finanziarie	100.000.000	100.000.000	
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>700.000.000</b>	<b>699.285.620</b>	

Protocollo d'intervento: **1421****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RESTAURO DELLA ROCCA MUNICIPALE E DI PIAZZA UMBERTO I°*  
 Comune **PIANELLO VAL TIDONE (PC)**  
 Finanziamento **L. 1.205 milioni**  
 - Tot. Impegnato **L. 1.203.719.753**  
 - Tot. Pagato **L. 1.203.719.753**  
 Cofinanziamento **L. 215 milioni**

*Rocca municipale e piazza Umberto I***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI PIANELLO VAL DIDONE**  
 Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**  
 C.Fis./P.IVA  
 Indirizzo **LARGO DAL VERME 54** **PIANELLO VAL DIDONE (PC)**  
 Recapiti **Telefono: 0523/994111** **Telefax:**

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
LICITAZIONE PRIVATA	CELLA GAETANO S.R.L.  VIA SAN NAZZARO 7 PIACENZA 00841080336	L. 983.862.827	L. 912.729.585	7,23
<b>Totali</b>		<b>L. 983.862.827</b>	<b>L. 912.729.585</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.359.000.000	L. 1.144.000.000	L. 0	L. 215.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.359.000.000	L. 1.144.000.000	L. 0	L. 215.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.359.000.000	L. 1.144.000.000	L. 0	L. 215.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.359.000.000	L. 1.144.000.000	L. 0	L. 215.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.359.000.000	L. 1.144.000.000	L. 0	L. 215.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.359.000.000	L. 1.144.000.000	L. 0	L. 215.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.420.492.192	L. 1.205.492.192	L. 0	L. 215.000.000	+ Lit. 61492192
DM 13/09/99	L. 1.420.492.192	L. 1.205.492.192	L. 0	L. 215.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.420.492.192	L. 1.205.492.192	L. 0	L. 215.000.000	
Automatico	L. 1.420.492.192	L. 1.205.492.192	L. 0	L. 215.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.420.492.192	L. 1.205.492.192	L. 0	L. 215.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.420.492.192	L. 1.205.492.192	L. 0	L. 215.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.420.492.192	L. 1.205.492.192	L. 0	L. 215.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.420.492.192	L. 1.205.492.192	L. 0	L. 215.000.000	

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (30/11/00)
Opere Civili	729.500.000	967.616.221
Opere Impiantistiche	233.500.000	105.823.000
Arredi e/o Attrezzature	78.000.000	55.163.654
Altre Voci	6	
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>1.041.000.006</b>	<b>1.128.602.875</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	100.000.000	122.695.430
Altre Spese Tecniche	10.000.000	17.804.077
Allacciamenti		
Imprevisti	75.635.000	2.809.992
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	110.365.000	107.343.922
IVA al 20%	22.000.000	39.694.630
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>318.000.000</b>	<b>290.348.051</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>1.359.000.006</b>	<b>1.418.950.926</b>
	Maggiore Spesa	59.950.920
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	1.144.000.000	1.203.950.926
Risorse proprie	215.000.000	215.000.000
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>1.359.000.000</b>	<b>1.418.950.926</b>

Protocollo d'intervento: **1485****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RECUPERO DI AMBIENTI DELL'ANTICA ABBAZIA DI S. COLOMBANO PER IL COMPLETAMENTO DEL MUSEO DELLA CITTA'*

Comune **BOBBIO (PC)**

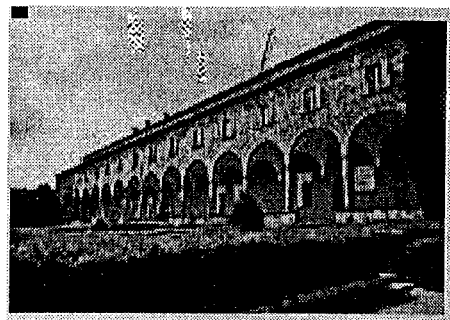
Finanziamento **L. 1.384 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 1.367.083.893**

- Tot. Pagato **L. 1.367.083.893**

Cofinanziamento **L. 395 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	21/11/98	21/11/98
Fine Lavori	27/08/99	30/10/99

*Abbazia di S. Colombano***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI BOBBIO**

Categoria **AB Enti pubblici**

C.Fis./P.IVA **00179440334**

Indirizzo **PIAZZETTA S. CHIARA, 1** **BOBBIO (PC)**

Recapiti **Telefono: 0523 962811** **Telefax: 0523 936666**

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
GARA APPALTO MAX R.A.	CONSORZIO VENETO COOPERATIVO VIA ULLO 5-MARGHERA (VE) 00228840278	L. 1.190.000.000	L. 1.036.966.000	12,86
		<b>Totali</b>	<b>L. 1.036.966.000</b>	
