

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 301.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 101.000.000	
DM 06/08/98	L. 301.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 101.000.000	
DM 20/11/98	L. 301.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 101.000.000	
DM 27/01/99	L. 301.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 101.000.000	
DM 09/02/99	L. 301.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 101.000.000	
DM 01/06/99	L. 301.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 101.000.000	
DM 05/08/99	L. 301.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 101.000.000	
DM 13/09/99	L. 301.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 101.000.000	
DM 16/11/99	L. 495.571.594	L. 200.000.000	L. 0	L. 295.571.594	+ Lit. 194571594
Automatico	L. 495.571.594	L. 200.000.000	L. 0	L. 295.571.594	
DM 21/07/00	L. 495.571.594	L. 200.000.000	L. 0	L. 295.571.594	
DM 01/08/00	L. 495.571.594	L. 200.000.000	L. 0	L. 295.571.594	
DM 14/12/00	L. 495.571.594	L. 200.000.000	L. 0	L. 295.571.594	
DM 14/02/01	L. 495.128.753	L. 199.557.159	L. 0	L. 295.571.594	- Lit. -442841

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (26/10/00)	
Opere Civili	190.000.000		
Opere Impiantistiche	50.000.000	316.419.419	
Arredi e/o Attrezzature			
Altre Voci			
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>240.000.000</b>	<b>316.419.419</b>	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Progettazione	20.000.000	30.000.000	
Altre Spese Tecniche	10.000.000	25.000.000	
Allacciamenti	1.000.000	15.000.000	
Imprevisti	6.000.000	18.507.392	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci		52.960.000	
IVA al 10%	24.000.000	31.641.942	
IVA al 20%		5.600.000	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>61.000.000</b>	<b>178.709.334</b>	
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>301.000.000</b>	<b>495.128.753</b>	
	Maggiore Spesa	194.128.753	
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	di progetto (Lire)	finale (Lire)	
Finanziamento ex 270/97	200.000.000	199.557.159	
Risorse proprie	101.000.000	295.571.594	
Altre fonti finanziarie			
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>301.000.000</b>	<b>495.128.753</b>	

Protocollo d'intervento: **2578****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RIFACIMENTO E COMPLETAMENTO DELLA COPERTURA DEGLI SCAVI DELL'AULA SETTENTRIONALE DELLA BASILICA PATRIARCALE*

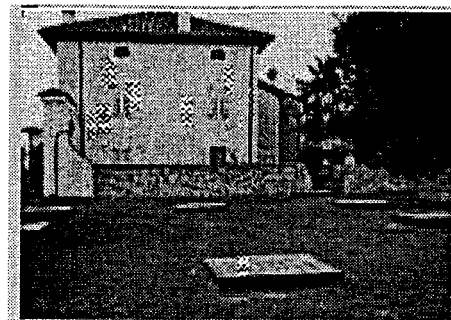
Comune **AQUILEIA (UD)**

Finanziamento **L. 3.054 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 3.022.080.664**

- Tot. Pagato **L. 3.022.080.664**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

*Basilica***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **ARCIDIOCESI DI GORIZIA**

Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**

C.Fis./P.IVA **91003490314**

Indirizzo **VIA ARCIVESCOVADO, 2** **GORIZIA (GO)**

Recapiti **Telefono: 0481 597601** **Telefax: 0481 531334**

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	PINAZZI COSTRUZIONI SRL VIA LANGHIRANO 9, PARMA 00485260343	L. 2.758.587.000	L. 2.488.245.474	9,80
Totali		L. 2.758.587.000	L. 2.488.245.474	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO


D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.324.000.000	L. 3.324.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 3.324.000.000	L. 3.324.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 3.324.000.000	L. 3.324.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 3.324.000.000	L. 3.324.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 3.324.000.000	L. 3.324.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 3.053.659.000	L. 3.053.659.000	L. 0	L. 0	Lit. -270341000
DM 05/08/99	L. 3.053.659.000	L. 3.053.659.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 3.053.659.000	L. 3.053.659.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 3.053.659.000	L. 3.053.659.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 3.053.659.000	L. 3.053.659.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 3.053.659.000	L. 3.053.659.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 3.053.659.000	L. 3.053.659.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 3.053.659.000	L. 3.053.659.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 3.053.659.000	L. 3.053.659.000	L. 0	L. 0	

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (27/03/01)	
Opere Civili	2.340.000.000	2.488.245.474	
Opere Impiantistiche			
Arredi e/o Attrezzature			
Altre Voci			
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>2.340.000.000</b>	<b>2.488.245.474</b>	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Progettazione	160.000.000	160.000.000	
Altre Spese Tecniche	70.000.000	70.000.000	
Allacciamenti			
Imprevisti	200.000.000	40.588.453	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%		248.824.547	
IVA al 20%	554.000.000	46.000.000	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>984.000.000</b>	<b>565.413.000</b>	
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>3.324.000.000</b>	<b>3.053.658.474</b>	
	<b>Economie</b>	<b>-270.341.526</b>	
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>	
Finanziamento ex 270/97	3.324.000.000	3.053.659.000	
Risorse proprie			
Altre fonti finanziarie			
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>3.324.000.000</b>	<b>3.053.659.000</b>	

Protocollo d'intervento: **3943****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO INFORMATIVO E DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE AI PERCORSI GIUBILARI</i>	
Comune	<b>PORDENONE (PN)</b>	
Finanziamento	<b>L. 1.692 milioni</b>	
	- Tot. Impegnato	<b>L. 1.692.221.061</b>
	- Tot. Pagato	<b>L. 1.692.221.061</b>
Cofinanziamento	<b>L. 50 milioni</b>	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<i>15/02/99</i>	<b>13/01/99</b>
Fine Lavori	<i>15/08/99</i>	<b>08/10/99</b>

*Villa Carinzia***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	AMM. PROVINCIALE DI PORDENONE	
Categoria	AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)	
C.Fis./P.IVA	00137050936	
Indirizzo	P.ZZA COSTANTINI, 3	PORDENONE (PD)
Recapiti	Telefono: 0434 2311	Telefax: 0434 26471

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	IDEAL OFFICE VIA VESPUCCI, 2 PORDENONE 00417140936	L. 125.000.000	L. 84.884.000	32,09
TRATTATIVA PRIVATA	CLOCCHIATI SPA VIA ADIGE 3, POVOLETTO (UD) 00109210320	L. 1.411.000.000	L. 1.266.372.500	10,25
Totali		L. 1.536.000.000	L. 1.351.256.500	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

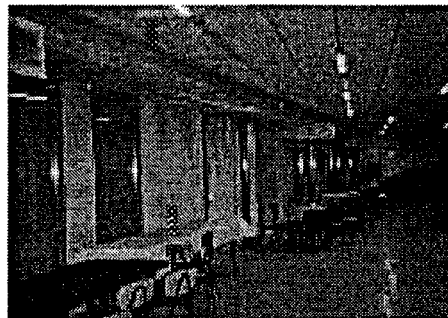
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.000.000.000	L. 1.950.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.000.000.000	L. 1.950.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.000.000.000	L. 1.950.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.000.000.000	L. 1.950.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.000.000.000	L. 1.950.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.000.000.000	L. 1.950.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.000.000.000	L. 1.950.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.000.000.000	L. 1.950.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.000.000.000	L. 1.950.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
Automatico	L. 2.000.000.000	L. 1.950.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.000.000.000	L. 1.950.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.000.000.000	L. 1.950.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.000.000.000	L. 1.950.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.742.221.061	L. 1.692.221.061	L. 0	L. 50.000.000	- Lit. -257778939

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (28/02/00)	
Opere Civili	800.000.000	1.266.361.099	
Opere Impiantistiche	555.000.000	61.880.594	
Arredi e/o Attrezzature	150.000.000	84.884.000	
Altre Voci			
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>1.505.000.000</b>		<b>1.413.125.693</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Progettazione	80.000.000	58.752.000	
Altre Spese Tecniche	30.000.000	98.042.400	
Allacciamenti	8.000.000		
Imprevisti	76.000.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci		22.500.000	
IVA al 10%		132.824.169	
IVA al 20%	301.000.000	16.979.800	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>495.000.000</b>		<b>329.098.369</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>2.000.000.000</b>		<b>1.742.224.062</b>
	<b>Economie</b>		<b>-257.775.938</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>		<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	1.950.000.000		1.692.221.061
Risorse proprie	50.000.000		50.000.000
Altre fonti finanziarie			
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>2.000.000.000</b>		<b>1.742.221.061</b>

Protocollo d'intervento: **5484****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *LOCALI DI ACCOGLIENZA PER RISTORO CON ANNESSI SERVIZI IMPIANTISTICA E PERCORSI ATTREZZATI INTERNI ED ESTERNI CON ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PER DISABILI*  
 Comune **TRIESTE (TS)**  
 Finanziamento **L. 1.398 milioni**  
     - Tot. Impegnato **L. 1.390.869.129**  
     - Tot. Pagato **L. 1.390.869.129**  
 Cofinanziamento **L. 0 milioni**  
     Previsione                      Effettiva  
 Inizio Lavori                      23/11/98                      09/12/98  
 Fine Lavori                         31/07/99                      15/10/99

*Tempio di Monte Grisa***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **PARROCCHIA MARIA MADRE E REGINA**  
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**  
 C.Fis./P.IVA **90031640320**  
 Indirizzo **CONTOVELLO, 455** **PROSECCO (TS)**  
 Recapiti **Telefono: 040 225366** **Telefax: 040 225289**

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	SAVINO SPA  VIA TORREBIANCA 26, TRIESTE 00050900323	L. 1.184.000.000	L. 1.115.328.000	5,80
<b>Totali</b>		<b>L. 1.184.000.000</b>	<b>L. 1.115.328.000</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.450.000.000	L. 1.450.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 1.450.000.000	L. 1.450.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 1.450.000.000	L. 1.450.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 1.450.000.000	L. 1.450.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 1.450.000.000	L. 1.450.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 1.450.000.000	L. 1.450.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 1.450.000.000	L. 1.450.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 1.382.000.000	L. 1.382.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -68000000
DM 16/11/99	L. 1.382.000.000	L. 1.382.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 1.382.000.000	L. 1.382.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 1.382.000.000	L. 1.382.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 1.382.000.000	L. 1.382.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 1.382.000.000	L. 1.382.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 1.398.408.329	L. 1.398.408.329	L. 0	L. 0	+ Lit. 16408329

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (13/03/01)
Opere Civili	1.184.000.000	
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>1.184.000.000</b>	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	133.200.000	
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%	131.800.000	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>265.000.000</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>1.449.000.000</b>	<b>1.398.408.329</b>
	<b>Economie</b>	<b>-50.591.671</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	1.450.000.000	1.398.408.329
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>1.450.000.000</b>	<b>1.398.408.329</b>

Protocollo d'intervento: **5485****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ADEGUAMENTO NORMATIVO FUNZIONALE E REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE*

Comune **TRIESTE (TS)**

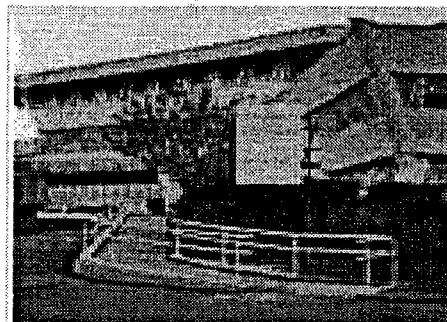
Finanziamento **L. 772 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 722.280.684**

- Tot. Pagato **L. 722.280.684**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	15/09/98	09/12/98
Fine Lavori	31/07/99	29/10/99

*Villaggio del Fanciullo***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **OPERA VILLAGGIO DEL FANCIULLO**

Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**

C.Fis./P.IVA **00093320323**

Indirizzo **VIA DI CONCONELLO, 16** **TRIESTE - OPICINA (TS)**

Recapiti **Telefono: 040 211175** **Telefax: 040 211369**

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA	CRAMER GIOVANNI E FIGLI SNC VIA BELPOGGIO 4, TRIESTE 00104180328	L. 547.461.910	L. 502.679.526	8,18
<b>Totali</b>		<b>L. 547.461.910</b>	<b>L. 502.679.526</b>	



## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 702.000.000	L. 702.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 702.000.000	L. 702.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 702.000.000	L. 702.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 702.000.000	L. 702.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 702.000.000	L. 702.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 702.000.000	L. 702.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 702.000.000	L. 702.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 702.000.000	L. 702.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 702.000.000	L. 702.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 702.000.000	L. 702.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 702.000.000	L. 702.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 702.000.000	L. 702.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 702.000.000	L. 702.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 772.000.000	L. 772.000.000	L. 0	L. 0	+ Lit. 70000000

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (21/08/01)
Opere Civili	406.000.000	
Opere Impiantistiche	83.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	59.000.000	
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>548.000.000</b>	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	27.000.000	
Altre Spese Tecniche	20.000.000	
Allacciamenti	4.000.000	
Imprevisti	7.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	16.000.000	
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	50.000.000	
IVA al 20%	30.000.000	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>154.000.000</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>702.000.000</b>	<b>772.000.000</b>
	Maggiore Spesa	70.000.000
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>		
	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	702.000.000	772.000.000
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>702.000.000</b>	<b>772.000.000</b>

Protocollo d'intervento: **5486**

## DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA PROGETTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL COLLE DI MUGGIA VECCHIA E DEL SUO SANTUARIO*

Comune **TRIESTE (TS)**

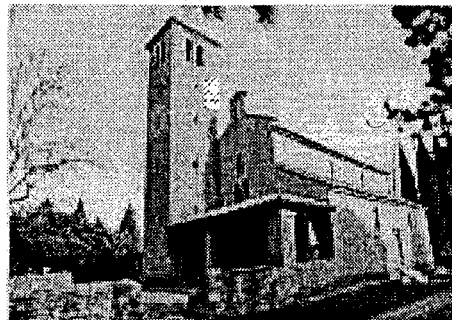
Finanziamento **L. 723 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 723.449.329**

- Tot. Pagato **L. 723.449.239**

Cofinanziamento **L. 341 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	30/09/98	09/12/98
Fine Lavori	30/07/99	30/08/99



Colle di Muggia Vecchia

## DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA**

Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**

C.Fis./P.IVA **90031900328**

Indirizzo **SALITA DI MUGGIA VECCHIA, 53** **MUGGIA - TRIESTE (TS)**

Recapiti **Telefono: 040 271164** **Telefax:**

## DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	I.C.I. COOP VIA SREBERNICH 17, RONCHI DEI LEGIONARI (GO) 00162760318	L. 800.000.000	L. 731.360.000	8,58
Totali		L. 800.000.000	L. 731.360.000	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.141.000.000	L. 800.000.000	L. 0	L. 341.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.141.000.000	L. 800.000.000	L. 0	L. 341.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.141.000.000	L. 800.000.000	L. 0	L. 341.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.141.000.000	L. 800.000.000	L. 0	L. 341.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.141.000.000	L. 800.000.000	L. 0	L. 341.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.141.000.000	L. 800.000.000	L. 0	L. 341.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.141.000.000	L. 800.000.000	L. 0	L. 341.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.073.000.000	L. 732.000.000	L. 0	L. 341.000.000	- Lit. -68000000
DM 16/11/99	L. 1.073.000.000	L. 732.000.000	L. 0	L. 341.000.000	
Automatico	L. 1.073.000.000	L. 732.000.000	L. 0	L. 341.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.073.000.000	L. 732.000.000	L. 0	L. 341.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.073.000.000	L. 732.000.000	L. 0	L. 341.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.073.000.000	L. 732.000.000	L. 0	L. 341.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.064.449.329	L. 723.449.329	L. 0	L. 341.000.000	- Lit. -8550671

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (11/03/00)
Opere Civili	650.000.000	
Opere Impiantistiche	90.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	60.000.000	
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>800.000.000</b>	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	99.100.000	
Altre Spese Tecniche	20.100.000	
Allacciamenti	5.000.000	
Imprevisti	58.400.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	3.000.000	
IVA al 10%	32.000.000	
IVA al 20%	123.400.000	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>341.000.000</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>1.141.000.000</b>	<b>1.064.449.329</b>
	<b>Economie</b>	<b>-76.550.671</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	800.000.000	723.449.329
Risorse proprie	341.000.000	341.000.000
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>1.141.000.000</b>	<b>1.064.449.329</b>

Protocollo d'intervento: **5487****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *ADEGUAMENTO ALLE MISURE DI SICUREZZA DELL'EDIFICIO ADIBITO A CONVITTO*  
 Comune **TRIESTE (TS)**  
 Finanziamento **L. 68 milioni**  
 - Tot. Impegnato **L. 68.495.490**  
 - Tot. Pagato **L. 68.495.490**  
 Cofinanziamento **L. 0 milioni**  
 Previsione Effettiva  
 Inizio Lavori *15/09/98* **09/12/98**  
 Fine Lavori *30/05/99* **19/03/99**

*Opera San Giuseppe***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **OPERA SAN GIUSEPPE**  
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**  
 C.Fis./P.IVA **80013870326**  
 Indirizzo **VIA DELL'ISTRIA, 61** **TRIESTE (TS)**  
 Recapiti **Telefono: 040 638523** **Telefax:**

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	C.E. PASCON FULVIO  VIA PAULIANA 8, TRIESTA 00570540328	L. 63.000.000	L. 55.395.900	12,07
Totali		L. 63.000.000	L. 55.395.900	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 76.000.000	L. 76.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 76.000.000	L. 76.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 76.000.000	L. 76.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 76.000.000	L. 76.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 76.000.000	L. 76.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 76.000.000	L. 76.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 76.000.000	L. 76.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 76.000.000	L. 76.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 76.000.000	L. 76.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 76.000.000	L. 76.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 76.000.000	L. 76.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 76.000.000	L. 76.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 76.000.000	L. 76.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 68.495.490	L. 68.495.490	L. 0	L. 0	- Lit. -7504510

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (01/02/00)
Opere Civili	63.000.000	
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>63.000.000</b>	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	6.700.000	
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	6.300.000	
IVA al 20%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>13.000.000</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>76.000.000</b>	<b>68.945.490</b>
	<b>Economie</b>	<b>-7.054.510</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	76.000.000	68.495.490
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>76.000.000</b>	<b>68.495.490</b>

Protocollo d'intervento: **5488****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>CASA RELIGIOSA ORATORIO SALESIANO S. G. BOSCO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE DI SERVIZI INTERNI CON AUMENTO DELLA RICETTIVITA'</i>	
Comune	<b>TRIESTE (TS)</b>	
Finanziamento	<b>L. 484 milioni</b>	
	- Tot. Impegnato	<b>L. 484.304.000</b>
	- Tot. Pagato	<b>L. 484.304.000</b>
Cofinanziamento	<b>L. 130 milioni</b>	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	30/07/98	12/02/99
Fine Lavori	30/05/99	17/12/99



*Casa religiosa oratorio salesiano S. Giovanni  
Bosco*

**DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	ORATORIO SALESIANI S. G. BOSCO	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	90032210321	
Indirizzo	VIA DELL'ISTRIA, 53	TRIESTE (TS)
Recapiti	Telefono: 040 638526-63849	Telefax:

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	MAGAZZINI A. BIZZOTTO S.r.l.  VIA SALUTE,48 - ROSSANO VENETO (VI) 00648970242	L. 30.000.000	L. 30.000.000	0,00
TRATTATIVA PRIVATA	TILATTI RINALDO S.r.l.  VIA TIEPOLO 1, UDINE 01410150302	L. 465.000.000	L. 459.420.000	1,20
Totali		L. 495.000.000	L. 489.420.000	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

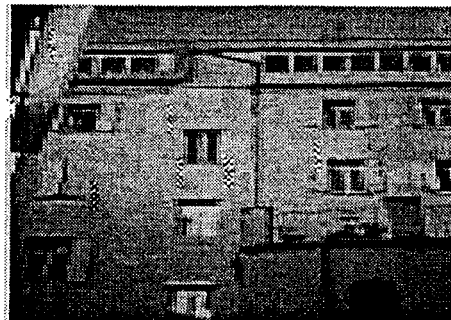
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 625.000.000	L. 495.000.000	L. 0	L. 130.000.000	
DM 06/08/98	L. 625.000.000	L. 495.000.000	L. 0	L. 130.000.000	
DM 20/11/98	L. 625.000.000	L. 495.000.000	L. 0	L. 130.000.000	
DM 27/01/99	L. 625.000.000	L. 495.000.000	L. 0	L. 130.000.000	
DM 09/02/99	L. 625.000.000	L. 495.000.000	L. 0	L. 130.000.000	
DM 01/06/99	L. 625.000.000	L. 495.000.000	L. 0	L. 130.000.000	
DM 05/08/99	L. 625.000.000	L. 495.000.000	L. 0	L. 130.000.000	
DM 13/09/99	L. 625.000.000	L. 495.000.000	L. 0	L. 130.000.000	
DM 16/11/99	L. 625.000.000	L. 495.000.000	L. 0	L. 130.000.000	
Automatico	L. 625.000.000	L. 495.000.000	L. 0	L. 130.000.000	
DM 21/07/00	L. 625.000.000	L. 495.000.000	L. 0	L. 130.000.000	
DM 01/08/00	L. 625.000.000	L. 495.000.000	L. 0	L. 130.000.000	
DM 14/12/00	L. 625.000.000	L. 495.000.000	L. 0	L. 130.000.000	
DM 14/02/01	L. 614.304.000	L. 484.304.000	L. 0	L. 130.000.000	- Lit. -10696000

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (14/09/00)
Opere Civili	348.000.000	
Opere Impiantistiche	117.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	30.000.000	
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>495.000.000</b>	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	56.000.000	
Altre Spese Tecniche	4.500.000	
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	2.000.000	
IVA al 10%	35.000.000	
IVA al 20%	33.100.000	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>130.600.000</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>625.600.000</b>	<b>614.304.000</b>
	Economie	-11.296.000
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	495.000.000	484.304.000
Risorse proprie	130.000.000	130.000.000
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>625.000.000</b>	<b>614.304.000</b>

Protocollo d'intervento: **5489****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO PER ACCOGLIENZA DI PELLEGRINI*  
 Comune **TRIESTE (TS)**  
 Finanziamento **L. 337 milioni**  
     - Tot. Impegnato **L. 316.562.400**  
     - Tot. Pagato **L. 316.562.400**  
 Cofinanziamento **L. 0 milioni**  
     Previsione                      Effettiva  
 Inizio Lavori            *30/09/98*                      **09/12/98**  
 Fine Lavori              *30/04/99*                      **30/11/99**

*Casa Famiglia della Giovane "Mater Dei"***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **CASA FAMIGLIA DELLA GIOVANE MATER DEI**  
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**  
 C.Fis./P.IVA **00214030322**  
 Indirizzo **STRADA DI GUARDIELLA, 8** **TRIESTE (TS)**  
 Recapiti **Telefono: 040 53580** **Telefax: 040 350441**

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	IM.P.R.E.  P.LE LEGNAMI 1, TRIESTE 00561100322	L. 240.000.000	L. 221.160.000	7,85
<b>Totali</b>		<b>L. 240.000.000</b>	<b>L. 221.160.000</b>	
