

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO


| D.M. | Costo Stimato | Finan. Attribuito | Altre Risorse | Risorse Proprie | Note |
|-------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| DM 21/04/98 | L. 4.578.000.000 | L. 4.578.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 06/08/98 | L. 4.578.000.000 | L. 4.578.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 20/11/98 | L. 4.578.000.000 | L. 4.578.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 27/01/99 | L. 4.578.000.000 | L. 4.578.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 09/02/99 | L. 4.578.000.000 | L. 4.578.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/06/99 | L. 4.578.000.000 | L. 4.578.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 05/08/99 | L. 4.578.000.000 | L. 4.578.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 13/09/99 | L. 4.578.000.000 | L. 4.578.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 16/11/99 | L. 3.751.000.000 | L. 3.751.000.000 | L. 0 | L. 0 | - Lit. -827000000 |
| Automatico | L. 3.751.000.000 | L. 3.751.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 21/07/00 | L. 3.751.000.000 | L. 3.751.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/08/00 | L. 3.751.000.000 | L. 3.751.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/12/00 | L. 3.751.000.000 | L. 3.751.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/02/01 | L. 3.981.970.031 | L. 3.981.970.031 | L. 0 | L. 0 | + Lit. 230970031 |

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione della rata di saldo (10/10/01) |
|--------------------------------|----------------------------|--|
| Opere Civili | 3.000.000.000 | 2.720.866.543 |
| Opere Impiantistiche | 500.000.000 | |
| Arredi e/o Attrezzature | 400.000.000 | 384.074.475 |
| Altre Voci | | |
| TOTALE LAVORI | 3.900.000.000 | 3.104.941.018 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | 175.000.000 | 291.563.709 |
| Altre Spese Tecniche | 4.160.000 | 6.383.683 |
| Allacciamenti | 10.000.000 | 48.058.800 |
| Imprevisti | 20.000.000 | |
| - Espropri o Acquisizioni | | |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | | |
| - Opere Impiantistiche | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | |
| - Altre voci | | |
| IVA al 10% | 353.000.000 | 272.086.654 |
| IVA al 20% | 115.840.000 | 135.627.705 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 678.000.000 | 753.720.551 |
| TOTALE COSTO | 4.578.000.000 | 3.858.661.569 |
| | Economie | -719.338.431 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 4.578.000.000 | 3.858.661.569 |
| Risorse proprie | | |
| Altre fonti finanziarie | | |
| TOTALE COPERTURE | 4.578.000.000 | 3.858.661.569 |

Protocollo d'intervento: **3057****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *OPERE DI RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN VINCENZO DE' PAOLI*Comune **GENOVA (GE)**Finanziamento **L. 234 milioni**- Tot. Impegnato **L. 219.386.000**- Tot. Pagato **L. 219.386.000**Cofinanziamento **L. 270 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *19/03/99* **15/04/99**Fine Lavori *01/07/99* **22/12/99***Chiesa di S. Vincenzo de' Paoli***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **FONDAZIONE BRIGNOLE SALE NEGRONI**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **80013350105**Indirizzo **VIA FASSOLO, 29****GENOVA (GE)**Recapiti **Telefono: 010 261805****Telefax: 010 267792****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % Ribasso |
|--------------------|---|------------------------|------------------------|-----------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | |
| Trattativa privata | C. E. I. s. r. l. via maragliano 8/1 Genova 00274560069 | L. 380.000.000 | L. 371.260.000 | 2,30 |
| Totali | | L. 380.000.000 | L. 371.260.000 | |

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

| D.M. | Costo Stimato | Finan. Attribuito | Altre Risorse | Risorse Proprie | Note |
|-------------|----------------|-------------------|---------------|-----------------|----------------|
| DM 21/04/98 | L. 540.000.000 | L. 270.000.000 | L. 0 | L. 270.000.000 | |
| DM 06/08/98 | L. 540.000.000 | L. 270.000.000 | L. 0 | L. 270.000.000 | |
| DM 20/11/98 | L. 540.000.000 | L. 270.000.000 | L. 0 | L. 270.000.000 | |
| DM 27/01/99 | L. 540.000.000 | L. 270.000.000 | L. 0 | L. 270.000.000 | |
| DM 09/02/99 | L. 540.000.000 | L. 270.000.000 | L. 0 | L. 270.000.000 | |
| DM 01/06/99 | L. 540.000.000 | L. 270.000.000 | L. 0 | L. 270.000.000 | |
| DM 05/08/99 | L. 540.000.000 | L. 270.000.000 | L. 0 | L. 270.000.000 | |
| DM 13/09/99 | L. 540.000.000 | L. 270.000.000 | L. 0 | L. 270.000.000 | |
| DM 16/11/99 | L. 504.000.000 | L. 234.000.000 | L. 0 | L. 270.000.000 | Lit. -36000000 |
| Automatico | L. 504.000.000 | L. 234.000.000 | L. 0 | L. 270.000.000 | |
| DM 21/07/00 | L. 504.000.000 | L. 234.000.000 | L. 0 | L. 270.000.000 | |
| DM 01/08/00 | L. 504.000.000 | L. 234.000.000 | L. 0 | L. 270.000.000 | |
| DM 14/12/00 | L. 504.000.000 | L. 234.000.000 | L. 0 | L. 270.000.000 | |
| DM 14/02/01 | L. 504.000.000 | L. 234.000.000 | L. 0 | L. 270.000.000 | |

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione della rata di saldo (27/08/01) | |
|------------------------------|----------------------------|--|--------------------|
| Opere Civili | 290.000.000 | 371.260.000 | |
| Opere Impiantistiche | 80.000.000 | | |
| Arredi e/o Attrezzature | 30.000.000 | 30.000.000 | |
| Altre Voci | | | |
| TOTALE LAVORI | 400.000.000 | | 401.260.000 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| Progettazione | 30.000.000 | 30.000.000 | |
| Altre Spese Tecniche | 10.000.000 | 10.000.000 | |
| Allacciamenti | 3.000.000 | | |
| Imprevisti | 7.000.000 | | |
| - Espropri o Acquisizioni | | | |
| - Area o Fabbricato | | | |
| - Opere Civili | | | |
| - Opere Impiantistiche | | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | | |
| - Altre voci | | | |
| IVA al 10% | | 40.126.000 | |
| IVA al 20% | 90.000.000 | 8.000.000 | |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 140.000.000 | | 88.126.000 |
| TOTALE COSTO | 540.000.000 | | 489.386.000 |
| | | Economie | -50.614.000 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | finale (Lire) | |
| Finanziamento ex 270/97 | 270.000.000 | 219.386.000 | |
| Risorse proprie | 270.000.000 | 270.000.000 | |
| Altre fonti finanziarie | | | |
| TOTALE COPERTURE | 540.000.000 | | 489.386.000 |

Protocollo d'intervento: **3132****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

| | | |
|-------------------|--|-----------------------|
| Titolo Intervento | <i>RISTRUTTURAZIONE INTERNA DELLA STRUTTURA DI OSPITALITA' PRESSO IL SEMINARIO VESCOVILE DIOCESANO</i> | |
| Comune | BORDIGHERA (IM) | |
| Finanziamento | L. 871 milioni | |
| | - Tot. Impegnato | L. 870.560.000 |
| | - Tot. Pagato | L. 870.560.000 |
| Cofinanziamento | L. 203 milioni | |
| | Previsione | Effettiva |
| Inizio Lavori | 01/02/99 | 22/03/99 |
| Fine Lavori | 30/09/99 | 26/10/99 |

*Seminario Vescovile diocesano***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

| | | |
|---------------|---|----------------------|
| Denominazione | SEMINARIO VESCOVILE | |
| Categoria | AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222); | |
| C.Fis./P.IVA | 81001850080 | |
| Indirizzo | VIA AURELIA., 143 | BORDIGHERA (IM) |
| Recapiti | Telefono: 0184 295261 | Telefax: 0184 251144 |

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % |
|---------------------------|---|------------------------|------------------------|---------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | Ribasso |
| GARA A TRATTATIVA PRIVATA | A.T.I DE VILLA L.E.S. SRL-VIALIT COSTR. GEN. SPA C.SO GARIBALDI, 36-VENTIMIGLIA (IM) | L. 800.000.000 | L. 675.600.000 | 15,55 |
| Totali | | L. 800.000.000 | L. 675.600.000 | |

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

| D.M. | Costo Stimato | Finan. Attribuito | Altre Risorse | Risorse Proprie | Note |
|-------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| DM 21/04/98 | L. 1.203.000.000 | L. 1.000.000.000 | L. 0 | L. 203.000.000 | |
| DM 06/08/98 | L. 1.203.000.000 | L. 1.000.000.000 | L. 0 | L. 203.000.000 | |
| DM 20/11/98 | L. 1.203.000.000 | L. 1.000.000.000 | L. 0 | L. 203.000.000 | |
| DM 27/01/99 | L. 1.203.000.000 | L. 1.000.000.000 | L. 0 | L. 203.000.000 | |
| DM 09/02/99 | L. 1.203.000.000 | L. 1.000.000.000 | L. 0 | L. 203.000.000 | |
| DM 01/06/99 | L. 1.203.000.000 | L. 1.000.000.000 | L. 0 | L. 203.000.000 | |
| DM 05/08/99 | L. 1.203.000.000 | L. 1.000.000.000 | L. 0 | L. 203.000.000 | |
| DM 13/09/99 | L. 1.203.000.000 | L. 1.000.000.000 | L. 0 | L. 203.000.000 | |
| DM 16/11/99 | L. 1.203.000.000 | L. 1.000.000.000 | L. 0 | L. 203.000.000 | |
| Automatico | L. 1.074.000.000 | L. 871.000.000 | L. 0 | L. 203.000.000 | - Lit. -129000000 |
| DM 21/07/00 | L. 1.074.000.000 | L. 871.000.000 | L. 0 | L. 203.000.000 | |
| DM 01/08/00 | L. 1.074.000.000 | L. 871.000.000 | L. 0 | L. 203.000.000 | |
| DM 14/12/00 | L. 1.074.000.000 | L. 871.000.000 | L. 0 | L. 203.000.000 | |
| DM 14/02/01 | L. 1.073.560.000 | L. 870.560.000 | L. 0 | L. 203.000.000 | - Lit. -440000 |

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione della rata di saldo (14/07/00) |
|------------------------------|----------------------------|--|
| Opere Civili | 550.000.000 | 755.090.400 |
| Opere Impiantistiche | 250.000.000 | |
| Arredi e/o Attrezzature | 112.600.000 | 114.571.334 |
| Altre Voci | | |
| TOTALE LAVORI | 912.600.000 | 869.661.734 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | 60.000.000 | 66.000.000 |
| Altre Spese Tecniche | 22.000.000 | 22.000.000 |
| Allacciamenti | | |
| Imprevisti | 80.000.000 | |
| - Espropri o Acquisizioni | | |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | | |
| - Opere Impiantistiche | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | |
| - Altre voci | | |
| IVA al 10% | 88.000.000 | 75.509.040 |
| IVA al 20% | 40.400.000 | 40.514.347 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 290.400.000 | 204.023.387 |
| TOTALE COSTO | 1.203.000.000 | 1.073.685.121 |
| | Economie | -129.314.879 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 1.000.000.000 | 870.560.000 |
| Risorse proprie | 203.000.000 | 203.000.000 |
| Altre fonti finanziarie | | 125.121 |
| TOTALE COPERTURE | 1.203.000.000 | 1.073.685.121 |

Protocollo d'intervento: **3135****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

| | | |
|-------------------|---|----------------|
| Titolo Intervento | <i>RISTRUTTURAZIONE INTERNA DELLA STRUTTURA DI OSPITALITA' PRESSO IL SANTUARIO DI LAMPEDUSA</i> | |
| Comune | CASTELLARO (IM) | |
| Finanziamento | L. 473 milioni | |
| | - Tot. Impegnato | L. 472.962.500 |
| | - Tot. Pagato | L. 472.962.500 |
| Cofinanziamento | L. 102 milioni | |
| | Previsione | Effettiva |
| Inizio Lavori | 01/02/99 | 14/04/99 |
| Fine Lavori | 30/09/99 | 03/12/99 |



Santuario di Lampedusa

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

| | | |
|---------------|---|-----------------|
| Denominazione | PARROCCHIA SAN PIETRO IN VINCOLI | |
| Categoria | AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222); | |
| C.Fis./P.IVA | 90008070089 | |
| Indirizzo | PIAZZA DELLA CHIESA | CASTELLARO (IM) |
| Recapiti | Telefono: 0184 479290 | Telefax: |

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % |
|---------------------------|--|------------------------|------------------------|---------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | Ribasso |
| GARA A TRATTATIVA PRIVATA | ARCO SOC. COOP. A R.L. CONSORZ. ARREZZO COSTRUZ. VIA XXV APRILE, 20 (AR) | L. 450.000.000 | L. 385.875.000 | 14,25 |

Totali L. 450.000.000 L. 385.875.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

| D.M. | Costo Stimato | Finan. Attribuito | Altre Risorse | Risorse Proprie | Note |
|-------------|----------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|
| DM 21/04/98 | L. 602.000.000 | L. 500.000.000 | L. 0 | L. 102.000.000 | |
| DM 06/08/98 | L. 602.000.000 | L. 500.000.000 | L. 0 | L. 102.000.000 | |
| DM 20/11/98 | L. 602.000.000 | L. 500.000.000 | L. 0 | L. 102.000.000 | |
| DM 27/01/99 | L. 602.000.000 | L. 500.000.000 | L. 0 | L. 102.000.000 | |
| DM 09/02/99 | L. 602.000.000 | L. 500.000.000 | L. 0 | L. 102.000.000 | |
| DM 01/06/99 | L. 602.000.000 | L. 500.000.000 | L. 0 | L. 102.000.000 | |
| DM 05/08/99 | L. 602.000.000 | L. 500.000.000 | L. 0 | L. 102.000.000 | |
| DM 13/09/99 | L. 602.000.000 | L. 500.000.000 | L. 0 | L. 102.000.000 | |
| DM 16/11/99 | L. 602.000.000 | L. 500.000.000 | L. 0 | L. 102.000.000 | |
| Automatico | L. 532.000.000 | L. 430.000.000 | L. 0 | L. 102.000.000 | - Lit. -70000000 |
| DM 21/07/00 | L. 532.000.000 | L. 430.000.000 | L. 0 | L. 102.000.000 | |
| DM 01/08/00 | L. 532.000.000 | L. 430.000.000 | L. 0 | L. 102.000.000 | |
| DM 14/12/00 | L. 532.000.000 | L. 430.000.000 | L. 0 | L. 102.000.000 | |
| DM 14/02/01 | L. 574.962.500 | L. 472.962.500 | L. 0 | L. 102.000.000 | + Lit. 42962500 |

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione della rata di saldo (18/06/00) |
|--------------------------------|----------------------------|--|
| Opere Civili | 330.000.000 | 330.000.000 |
| Opere Impiantistiche | 120.000.000 | 120.000.000 |
| Arredi e/o Attrezzature | | |
| Altre Voci | | |
| TOTALE LAVORI | 450.000.000 | 450.000.000 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | 30.000.000 | 30.000.000 |
| Altre Spese Tecniche | 11.000.000 | 11.000.000 |
| Allacciamenti | | |
| Imprevisti | 53.000.000 | 53.000.000 |
| - Espropri o Acquisizioni | | |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | | |
| - Opere Impiantistiche | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | |
| - Altre voci | | |
| IVA al 10% | 50.300.000 | 50.300.000 |
| IVA al 20% | 8.200.000 | 8.200.000 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 152.500.000 | 152.500.000 |
| TOTALE COSTO | 602.500.000 | 602.500.000 |
| | | 0 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 500.000.000 | 500.000.000 |
| Risorse proprie | 102.000.000 | 102.000.000 |
| Altre fonti finanziarie | | |
| TOTALE COPERTURE | 602.000.000 | 602.000.000 |

Protocollo d'intervento: **3432****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

| | | |
|-------------------|--|-----------------------|
| Titolo Intervento | <i>RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI DI PERTINENZA DEL SANTUARIO N.S. DELLA GUARDIA RIORDINO E SISTEMAZIONE DELLE PERCORRENZE PEDONALI REALIZZAZIONE DI SISTEMA ANTINCENDIO BOSCHIVO OPERE DI MIGLIORAMENTO E RICOSTITUZIONE DELLE SUPERFICI A VERDE</i> | |
| Comune | CERANESI (GE) | |
| Finanziamento | L. 851 milioni | |
| | - Tot. Impegnato | L. 851.781.600 |
| | - Tot. Pagato | L. 823.078.966 |
| Cofinanziamento | L. 100 milioni | |
| | Previsione | Effettiva |
| Inizio Lavori | 01/09/98 | 01/09/98 |
| Fine Lavori | 30/06/99 | 31/07/99 |

*Santuario di Nostra Signora della Guardia***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

| | | |
|---------------|---|---------------------|
| Denominazione | COMUNITA' MONTANA ALTA VAL POLCEVERA | |
| Categoria | AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29) | |
| C.Fis./P.IVA | 80041770100 | |
| Indirizzo | VIA BARTOLOMEO PARODI | CERANESI (GE) |
| Recapiti | Telefono: 010 782707 | Telefax: 010 784070 |

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

| Procedura | Denominazione Ditta Aggjudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggjudicazione | % Ribasso |
|---------------------|---|------------------------|------------------------|-----------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | |
| licitazione privata | Giustiniana s. r. l. Gavi (AL) loc. Rovereto, 5 83000310066 | L. 740.000.000 | L. 699.818.000 | 5,43 |
| Totali | | L. 740.000.000 | L. 699.818.000 | |

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO


| D.M. | Costo Stimato | Finan. Attribuito | Altre Risorse | Risorse Proprie | Note |
|-------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|
| DM 21/04/98 | L. 1.000.000.000 | L. 900.000.000 | L. 0 | L. 100.000.000 | |
| DM 06/08/98 | L. 1.000.000.000 | L. 900.000.000 | L. 0 | L. 100.000.000 | |
| DM 20/11/98 | L. 1.000.000.000 | L. 900.000.000 | L. 0 | L. 100.000.000 | |
| DM 27/01/99 | L. 1.000.000.000 | L. 900.000.000 | L. 0 | L. 100.000.000 | |
| DM 09/02/99 | L. 951.000.000 | L. 851.000.000 | L. 0 | L. 100.000.000 | - Lit. -49000000 |
| DM 01/06/99 | L. 951.000.000 | L. 851.000.000 | L. 0 | L. 100.000.000 | |
| DM 05/08/99 | L. 951.000.000 | L. 851.000.000 | L. 0 | L. 100.000.000 | |
| DM 13/09/99 | L. 951.000.000 | L. 851.000.000 | L. 0 | L. 100.000.000 | |
| DM 16/11/99 | L. 951.000.000 | L. 851.000.000 | L. 0 | L. 100.000.000 | |
| Automatico | L. 951.000.000 | L. 851.000.000 | L. 0 | L. 100.000.000 | |
| DM 21/07/00 | L. 951.000.000 | L. 851.000.000 | L. 0 | L. 100.000.000 | |
| DM 01/08/00 | L. 951.000.000 | L. 851.000.000 | L. 0 | L. 100.000.000 | |
| DM 14/12/00 | L. 951.000.000 | L. 851.000.000 | L. 0 | L. 100.000.000 | |
| DM 14/02/01 | L. 951.000.000 | L. 851.000.000 | L. 0 | L. 100.000.000 | |

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione della rata di saldo (08/05/00) |
|--------------------------------|----------------------------|--|
| Opere Civili | 555.000.000 | 699.818.000 |
| Opere Impiantistiche | 185.000.000 | |
| Arredi e/o Attrezzature | | |
| Altre Voci | | |
| TOTALE LAVORI | 740.000.000 | 699.818.000 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | 74.000.000 | 74.000.000 |
| Altre Spese Tecniche | 11.500.000 | 11.500.000 |
| Allacciamenti | | |
| Imprevisti | 6.100.000 | 6.123.000 |
| - Espropri o Acquisizioni | | |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | 1.300.000 | 1.710.000 |
| - Opere Impiantistiche | 400.000 | |
| - Arredi e/o attrezzature | | |
| - Altre voci | | |
| IVA al 10% | | |
| IVA al 20% | 166.700.000 | 158.630.000 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 260.000.000 | 251.963.000 |
| TOTALE COSTO | 1.000.000.000 | 951.781.000 |
| | Economie | -48.219.000 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 851.000.000 | 851.781.000 |
| Risorse proprie | 100.000.000 | 100.000.000 |
| Altre fonti finanziarie | | |
| TOTALE COPERTURE | 951.000.000 | 951.781.000 |

Protocollo d'intervento: **3472****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RESTAURO RISANAMENTO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO COSTITUITO DALLA CATTEDRALE E DAL CHIOSTRO DI SAN LORENZO*Comune **GENOVA (GE)**Finanziamento **L. 3.291 milioni**- Tot. Impegnato **L. 3.291.223.141**- Tot. Pagato **L. 3.291.223.140**Cofinanziamento **L. 1.343 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *31/08/98* **23/09/98**Fine Lavori *01/09/99* **28/12/99***Cattedrale e Chiostro di S. Lorenzo***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **ARCIDIOCESI DI GENOVA**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **95013290101**Indirizzo **PIAZZA MATTEOTTI, 4****GENOVA (GE)**Recapiti **Telefono: 010 27001****Telefax: 010 2700220****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % |
|---------------------|--|-------------------------|-------------------------|---------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | Ribasso |
| TRATTATIVA PRIVATA | SIST S.R.L. STRADA VECCHIA NOSTRA SIGNORA DEL MONTE 3r (GE) | L. 171.381.300 | L. 166.634.038 | 2,77 |
| pubblico incanto | RISPOSTA SRL VIA EINSTEIN 10 VILLORBA TREVISO 03133930267 | L. 900.000.000 | L. 755.903.400 | 16,01 |
| LICITAZIONI PRIVATA | ATI BORCHI CARLO E F.LLI S.N.C. CAPOGRUPPO VIA A.ODERO 1/6 GENOVA 00640880100 | L. 2.886.670.396 | L. 2.238.612.892 | 22,45 |
| Totali | | L. 3.958.051.696 | L. 3.161.150.330 | |

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

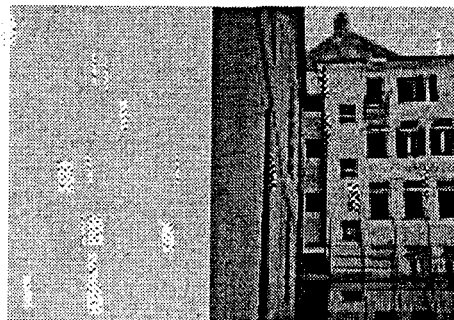
| D.M. | Costo Stimato | Finan. Attribuito | Altre Risorse | Risorse Proprie | Note |
|-------------|------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|
| DM 21/04/98 | L. 5.220.000.000 | L. 4.220.000.000 | L. 0 | L. 1.000.000.000 | |
| DM 06/08/98 | L. 5.220.000.000 | L. 4.220.000.000 | L. 0 | L. 1.000.000.000 | |
| DM 20/11/98 | L. 5.220.000.000 | L. 4.220.000.000 | L. 0 | L. 1.000.000.000 | |
| DM 27/01/99 | L. 5.220.000.000 | L. 4.220.000.000 | L. 0 | L. 1.000.000.000 | |
| DM 09/02/99 | L. 4.473.474.181 | L. 3.473.474.181 | L. 0 | L. 1.000.000.000 | - Lit. -746525819 |
| DM 01/06/99 | L. 4.473.474.181 | L. 3.473.474.181 | L. 0 | L. 1.000.000.000 | |
| DM 05/08/99 | L. 4.473.474.181 | L. 3.473.474.181 | L. 0 | L. 1.000.000.000 | |
| DM 13/09/99 | L. 4.473.474.181 | L. 3.473.474.181 | L. 0 | L. 1.000.000.000 | |
| DM 16/11/99 | L. 4.473.474.181 | L. 3.473.474.181 | L. 0 | L. 1.000.000.000 | |
| Automatico | L. 4.816.673.459 | L. 3.473.474.181 | L. 0 | L. 1.343.199.278 | + Lit. 343199278 |
| DM 21/07/00 | L. 4.816.673.459 | L. 3.473.474.181 | L. 0 | L. 1.343.199.278 | |
| DM 01/08/00 | L. 4.816.673.459 | L. 3.473.474.181 | L. 0 | L. 1.343.199.278 | |
| DM 14/12/00 | L. 4.816.673.459 | L. 3.473.474.181 | L. 0 | L. 1.343.199.278 | |
| DM 14/02/01 | L. 4.634.422.419 | L. 3.291.223.141 | L. 0 | L. 1.343.199.278 | - Lit. -182251040 |

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione della rata di saldo (12/09/00) |
|--------------------------------|----------------------------|--|
| Opere Civili | 2.917.000.000 | 2.631.513.406 |
| Opere Impiantistiche | 200.000.000 | 164.454.628 |
| Arredi e/o Attrezzature | 900.000.000 | 966.637.330 |
| Altre Voci | | |
| TOTALE LAVORI | 4.017.000.000 | 3.762.605.364 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | 217.000.000 | 215.309.000 |
| Altre Spese Tecniche | 272.000.000 | 176.654.763 |
| Allacciamenti | 20.000.000 | 21.000.000 |
| Imprevisti | 80.000.000 | |
| - Espropri o Acquisizioni | | |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | | |
| - Opere Impiantistiche | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | |
| - Altre voci | | |
| IVA al 10% | 292.000.000 | 376.260.538 |
| IVA al 20% | 322.000.000 | 82.592.754 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 1.203.000.000 | 871.817.055 |
| TOTALE COSTO | 5.220.000.000 | 4.634.422.419 |
| | Economie | -585.577.581 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 4.220.000.000 | 3.291.223.141 |
| Risorse proprie | 1.000.000.000 | 1.343.199.278 |
| Altre fonti finanziarie | | |
| TOTALE COPERTURE | 5.220.000.000 | 4.634.422.419 |

Protocollo d'intervento: **3572****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento REALIZZAZIONE DEL MUSEO DIOCESANO NEL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA
CATTEDRALE DI SAVONA
Comune SAVONA (SV)
Finanziamento L. 505 milioni
- Tot. Impegnato L. 505.102.778
- Tot. Pagato L. 505.102.778
Cofinanziamento L. 0 milioni
Previsione Effettiva
Inizio Lavori 26/10/98 30/11/98
Fine Lavori 23/07/99 14/12/99



Museo diocesano

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione DIOCESI DI SAVONA NOLI
Categoria AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);
C.Fis./P.IVA 92015780098
Indirizzo PIAZZA DEL VESCOVADO, 13 R SAVONA (SV)
Recapiti Telefono: 019 829410 Telefax: 019 853342

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % |
|--------------------|--|------------------------|------------------------|---------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | Ribasso |
| TRATTATIVA PRIVATA | SACCHI GEOM. ALBERTO SNC VIA GARRONI, 11R SV 00511260093 | L. 433.636.096 | L. 411.051.831 | 5,21 |
| Totali | | L. 433.636.096 | L. 411.051.831 | |

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

| D.M. | Costo Stimato | Finan. Attribuito | Altre Risorse | Risorse Proprie | Note |
|-------------|----------------|-------------------|---------------|-----------------|----------------|
| DM 21/04/98 | L. 530.000.000 | L. 530.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 06/08/98 | L. 530.000.000 | L. 530.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 20/11/98 | L. 530.000.000 | L. 530.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 27/01/99 | L. 530.000.000 | L. 530.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 09/02/99 | L. 530.000.000 | L. 530.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/06/99 | L. 530.000.000 | L. 530.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 05/08/99 | L. 530.000.000 | L. 530.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 13/09/99 | L. 530.000.000 | L. 530.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 16/11/99 | L. 506.000.000 | L. 506.000.000 | L. 0 | L. 0 | Lit. -24000000 |
| Automatico | L. 506.000.000 | L. 506.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 21/07/00 | L. 506.000.000 | L. 506.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/08/00 | L. 506.000.000 | L. 506.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/12/00 | L. 506.000.000 | L. 506.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/02/01 | L. 505.102.778 | L. 505.102.778 | L. 0 | L. 0 | Lit. -897222 |

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione della rata di saldo (25/09/00) | |
|------------------------------|----------------------------|--|--------------------|
| Opere Civili | 167.600.000 | 411.048.404 | |
| Opere Impiantistiche | 119.700.000 | | |
| Arredi e/o Attrezzature | 120.000.000 | | |
| Altre Voci | | | |
| TOTALE LAVORI | 407.300.000 | | 411.048.404 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| Progettazione | 45.005.000 | 42.074.762 | |
| Altre Spese Tecniche | 17.000.000 | 10.874.772 | |
| Allacciamenti | | | |
| Imprevisti | 20.365.000 | | |
| - Espropri o Acquisizioni | | | |
| - Area o Fabbricato | | | |
| - Opere Civili | | | |
| - Opere Impiantistiche | | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | | |
| - Altre voci | | | |
| IVA al 10% | 40.730.000 | 41.104.840 | |
| IVA al 20% | | | |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 123.100.000 | | 94.054.374 |
| TOTALE COSTO | 530.400.000 | | 505.102.778 |
| | Economie | | -25.297.222 |
| COPERTURA FINANZIARIA | | | |
| Finanziamento ex 270/97 | di progetto (Lire) | | finale (Lire) |
| Risorse proprie | 530.000.000 | | 505.157.014 |
| Altre fonti finanziarie | | | |
| TOTALE COPERTURE | 530.000.000 | | 505.157.014 |

Protocollo d'intervento: **3683****DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO**

| | | |
|-------------------|---|----------------|
| Titolo Intervento | <i>RIPRISTINO DI UN TRATTO DELL' ANTICA VIA ROMEA CHE A PIEDI CONDUCEVA DA CARRODANO AL SANTUARIO DI N.S. DI ROVERANO AL PASSO DEL BRACCO CON RESTAURO DEL PONTE MEDIOEVALE A DUE ARCHI</i> | |
| Comune | CARRODANO (SP) | |
| Finanziamento | L. 191 milioni | |
| | - Tot. Impegnato | L. 190.921.868 |
| | - Tot. Pagato | L. 190.921.868 |
| Cofinanziamento | L. 50 milioni | |
| | Previsione | Effettiva |
| Inizio Lavori | 19/02/99 | 23/03/99 |
| Fine Lavori | 30/08/99 | 14/10/99 |



Tratto dell'antica via romea: Carrodano - Santuario N. S. di Roverano - Passo del Bracco

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

| | | |
|---------------|---|----------------------|
| Denominazione | COMUNE DI CARRODANO | |
| Categoria | AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29) | |
| C.Fis./P.IVA | 00213320112 | |
| Indirizzo | PIAZZA 25 GENNAIO 1945, 12 | CARRODANO (SP) |
| Recapiti | Telefono: 0187 893675 | Telefax: 0187 893675 |

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % Ribasso |
|--------------------|--|------------------------|------------------------|-----------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | |
| Trattativa Privata | Impresa Enzo Giannetto Via Privata Provina 1- Romito Magra (SP) GNNNZE53T11A373K | L. 223.400.640 | L. 176.017.365 | 21,21 |
| Totali | | L. 223.400.640 | L. 176.017.365 | |

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

| D.M. | Costo Stimato | Finan. Attribuito | Altre Risorse | Risorse Proprie | Note |
|-------------|----------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|
| DM 21/04/98 | L. 308.000.000 | L. 258.000.000 | L. 0 | L. 50.000.000 | |
| DM 06/08/98 | L. 308.000.000 | L. 258.000.000 | L. 0 | L. 50.000.000 | |
| DM 20/11/98 | L. 308.000.000 | L. 258.000.000 | L. 0 | L. 50.000.000 | |
| DM 27/01/99 | L. 308.000.000 | L. 258.000.000 | L. 0 | L. 50.000.000 | |
| DM 09/02/99 | L. 308.000.000 | L. 258.000.000 | L. 0 | L. 50.000.000 | |
| DM 01/06/99 | L. 308.000.000 | L. 258.000.000 | L. 0 | L. 50.000.000 | |
| DM 05/08/99 | L. 308.000.000 | L. 258.000.000 | L. 0 | L. 50.000.000 | |
| DM 13/09/99 | L. 308.000.000 | L. 258.000.000 | L. 0 | L. 50.000.000 | |
| DM 16/11/99 | L. 308.000.000 | L. 258.000.000 | L. 0 | L. 50.000.000 | |
| Automatico | L. 308.000.000 | L. 258.000.000 | L. 0 | L. 50.000.000 | |
| DM 21/07/00 | L. 308.000.000 | L. 258.000.000 | L. 0 | L. 50.000.000 | |
| DM 01/08/00 | L. 308.000.000 | L. 258.000.000 | L. 0 | L. 50.000.000 | |
| DM 14/12/00 | L. 308.000.000 | L. 258.000.000 | L. 0 | L. 50.000.000 | |
| DM 14/02/01 | L. 240.977.050 | L. 190.977.050 | L. 0 | L. 50.000.000 | - Lit. -67022950 |

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione della rata di saldo (17/01/01) |
|--------------------------------|----------------------------|--|
| Opere Civili | 220.000.000 | 184.747.871 |
| Opere Impiantistiche | | |
| Arredi e/o Attrezzature | 10.000.000 | |
| Altre Voci | | |
| TOTALE LAVORI | 230.000.000 | 184.747.871 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | 18.000.000 | 30.800.000 |
| Altre Spese Tecniche | 9.000.000 | |
| Allacciamenti | | |
| Imprevisti | | |
| - Espropri o Acquisizioni | | |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | | |
| - Opere Impiantistiche | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | |
| - Altre voci | | |
| IVA al 10% | | 19.090.797 |
| IVA al 20% | 51.000.000 | 6.283.200 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 78.000.000 | 56.173.997 |
| TOTALE COSTO | 308.000.000 | 240.921.868 |
| | Economie | -67.078.132 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 258.000.000 | 190.921.868 |
| Risorse proprie | 50.000.000 | 50.000.000 |
| Altre fonti finanziarie | | |
| TOTALE COPERTURE | 308.000.000 | 240.921.868 |

Protocollo d'intervento: **4994****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DELLA CATTEDRALE DI SAN MICHELE E RECUPERO DELLA PIAZZETTA DEI LEONI PROSPICIENTE L'ABSIDE*

Comune **ALBENGA (SV)**

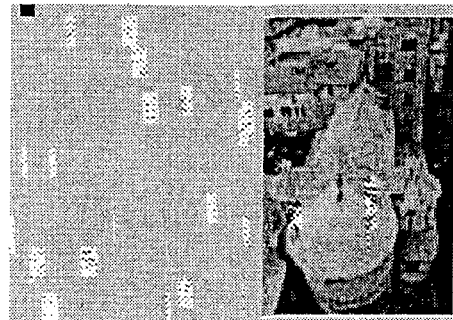
Finanziamento **L. 701 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 700.962.296**

- Tot. Pagato **L. 700.962.296**

Cofinanziamento **L. 160 milioni**

| | | |
|---------------|------------|-----------|
| | Previsione | Effettiva |
| Inizio Lavori | 15/12/98 | 09/11/98 |
| Fine Lavori | 30/09/99 | 23/11/99 |

*Cattedrale di San Michele***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **DIOCESI DI ALBENGA - IMPERIA**

Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**

C.Fis./P.IVA **81014340095**

Indirizzo **PIAZZA DEI LEONI, 1** **ALBENGA (SV)**

Recapiti **Telefono: 0182 50306-51933** **Telefax: 0182 51440**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % |
|--------------------|--|------------------------|------------------------|---------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | Ribasso |
| TRATTATIVA PRIVATA | FORMENTO FILIPPO CARLO E C. SNC VIA PER CALICE ZONA INDUSTR. FINALE LIG. (SV) 01065030098 | L. 700.000.000 | L. 670.600.000 | 4,20 |
| Totali | | L. 700.000.000 | L. 670.600.000 | |
