

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 4.186.000.000	L. 4.186.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 4.186.000.000	L. 4.186.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 4.186.000.000	L. 4.186.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 4.186.000.000	L. 4.186.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 4.186.000.000	L. 4.186.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 4.186.000.000	L. 4.186.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 4.186.000.000	L. 4.186.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 3.670.000.000	L. 3.670.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -516000000
DM 16/11/99	L. 3.670.000.000	L. 3.670.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 3.670.000.000	L. 3.670.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 3.670.000.000	L. 3.670.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 3.670.000.000	L. 3.670.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 3.670.000.000	L. 3.670.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 3.601.083.444	L. 3.601.083.444	L. 0	L. 0	- Lit. -68916556

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (10/10/00)
Opere Civili	2.500.000.000	170.000.000
Opere Impiantistiche	400.000.000	2.584.616.372
Arredi e/o Attrezzature	100.000.000	
Altre Voci	150.000.000	
TOTALE LAVORI	3.150.000.000	2.754.616.372
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	254.000.000	70.000.000
Altre Spese Tecniche	30.000.000	365.056.580
Allacciamenti	50.000.000	
Imprevisti	250.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche	24.000.000	
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		30.779.008
IVA al 10%	337.000.000	258.461.637
IVA al 20%	91.000.000	122.169.847
SOMME A DISPOSIZIONE	1.036.000.000	846.467.072
TOTALE COSTO	4.186.000.000	3.601.083.444
	Economie	-584.916.556
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	4.186.000.000	3.601.083.444
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	4.186.000.000	3.601.083.444

Protocollo d'intervento: **6173**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *COMPLETAMENTO DI STRUTTURA TURISTICO RICETTIVA OSTELLO CON RIUSO DELLE DIPENDENZE DI PALAZZO GIORGI*

Comune **SANTA SOFIA (FO)**

Finanziamento **L. 960 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 745.308.980**

- Tot. Pagato **L. 372.654.290**

Cofinanziamento **L. 1.381 milioni**



Palazzo Giorgi

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **COMUNE DI SANTA SOFIA**

Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**

C.Fis./P.IVA **80008900401**

Indirizzo **PIAZZA MATTEOTTI, 1** **SANTA SOFIA (FO)**

Recapiti **Telefono: 0543 974511** **Telefax: 0543 970345**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Agjudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
ASTA PUBBLICA	DITTA SIEM S.N.C. DI CERBARA E LEONARDI VIA MURGINAGLIE 407 SARSINA (FO)	L. 155.000.000	L. 143.231.000	7,59
ASTA PUBBLICA	DITTA FANTOZZI S.N.C. VIA LUNGARNO GAMBACORTI 25 PISA	L. 295.000.000	L. 278.232.000	5,68
PUBBLICO INCANTO	SOC. COOP. EDILE DI PREDAPPIO A R.L. VIA ROMA,70-PREDAPPIO-FO 00125300400	L. 999.000.000	L. 947.251.800	5,18
Totali		L. 1.449.000.000	L. 1.368.714.800	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.200.000.000	L. 819.000.000	L. 1.071.000.000	L. 310.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.200.000.000	L. 819.000.000	L. 1.071.000.000	L. 310.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.200.000.000	L. 819.000.000	L. 1.071.000.000	L. 310.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.200.000.000	L. 819.000.000	L. 1.071.000.000	L. 310.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.143.076.980	L. 762.076.980	L. 0	L. 1.381.000.000	- Lit. -56923020
DM 01/06/99	L. 2.143.076.980	L. 762.076.980	L. 0	L. 1.381.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.143.076.980	L. 762.076.980	L. 0	L. 1.381.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.143.076.980	L. 762.076.980	L. 0	L. 1.381.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.143.076.980	L. 762.076.980	L. 0	L. 1.381.000.000	
Automatico	L. 2.357.516.376	L. 976.516.376	L. 0	L. 1.381.000.000	+ Lit. 214439396
DM 21/07/00	L. 2.357.516.376	L. 976.516.376	L. 0	L. 1.381.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.357.516.376	L. 976.516.376	L. 0	L. 1.381.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.357.516.376	L. 976.516.376	L. 0	L. 1.381.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.340.748.376	L. 959.748.376	L. 0	L. 1.381.000.000	- Lit. -16768000

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

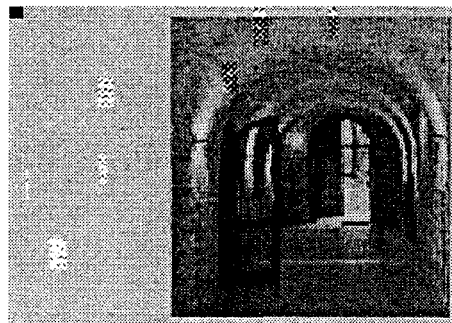
A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (27/04/99)
Opere Civili	647.809.990	750.974.400
Opere Impiantistiche	207.368.786	196.277.400
Arredi e/o Attrezzature	485.000.000	295.000.000
Altre Voci	114.821.224	155.000.000
TOTALE LAVORI	1.455.000.000	1.397.251.800
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	134.974.112	134.970.000
Altre Spese Tecniche	89.017.888	89.022.000
Allacciamenti		
Imprevisti	17.008.000	27.108.000
- Espropri o Acquisizioni	300.000.000	300.000.000
- Area o Fabbricato	10.000.000	10.000.000
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	97.000.000	94.725.180
IVA al 20%	97.000.000	90.000.000
SOMME A DISPOSIZIONE	745.000.000	745.825.180
TOTALE COSTO	2.200.000.000	2.143.076.980
	Economie	-56.923.020
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	819.000.000	762.076.980
Risorse proprie	310.000.000	1.381.000.000
Altre fonti finanziarie	1.071.000.000	
TOTALE COPERTURE	2.200.000.000	2.143.076.980

Protocollo d'intervento: - 6230

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PER LA RISTORAZIONE*Comune **CESENA (FO)**Finanziamento **L. 1.514 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.513.937.427**- Tot. Pagato **L. 1.513.437.427**Cofinanziamento **L. 1 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *03/12/98* **30/10/98**Fine Lavori *05/10/99* **31/08/99***Abbazia di S. Maria del Monte*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **MONASTERO DI S.MARIA DEL MONTE**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **81005450408**Indirizzo **VIA DEL MONTE, 999****CESENA (FO)**Recapiti **Telefono: 0547 302061****Telefax:**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA ART.24 L.109/94	A.T.I. S.I.S.E.T. S.A.S. CON C.B.C. S.N.C. VIA ROMA 31 CASTILENTI (TE) 00740350673	L. 1.120.156.926	L. 1.100.554.178	1,75
Totali		L. 1.120.156.926	L. 1.100.554.178	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO


D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 06/08/98	L. 1.536.000.000	L. 1.536.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 1.536.000.000	L. 1.536.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 1.536.000.000	L. 1.536.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 1.536.000.000	L. 1.536.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 1.536.000.000	L. 1.536.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 1.515.000.000	L. 1.515.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -21000000
DM 13/09/99	L. 1.515.000.000	L. 1.515.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 1.515.000.000	L. 1.515.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 1.515.000.000	L. 1.515.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 1.515.000.000	L. 1.515.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 1.515.000.000	L. 1.515.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 1.515.000.000	L. 1.515.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 1.514.737.517	L. 1.513.937.427	L. 0	L. 800.090	- Lit. -262483

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (01/02/00)	
Opere Civili	760.000.000	864.047.499	
Opere Impiantistiche	220.000.000	257.940.662	
Arredi e/o Attrezzature	120.000.000	49.455.450	
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	1.100.000.000		1.171.443.611
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	82.500.000	70.000.000	
Altre Spese Tecniche	116.000.000	101.000.000	
Allacciamenti	16.000.000	9.500.000	
Imprevisti	49.000.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci	4.300.000	3.420.000	
IVA al 10%	128.500.000	112.198.816	
IVA al 20%	39.700.000	46.675.090	
SOMME A DISPOSIZIONE	436.000.000		342.793.906
TOTALE COSTO	1.536.000.000		1.514.237.517
		Economie	-21.762.483
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.536.000.000		1.514.237.517
Risorse proprie			800.090
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	1.536.000.000		1.515.037.607

Protocollo d'intervento: **6240****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>VILLA GUASTAVILLANI UNA RESIDENZA RINASCIMENTALE IMMERSA NEL VERDE COLLINARE RESTITUITA A NUOVA VITA CULTURALE E DI ACCOGLIENZA</i>	
Comune	BOLOGNA (BO)	
Finanziamento	L. 1.535 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 815.839.934
	- Tot. Pagato	L. 407.919.970
Cofinanziamento	L. 10.000 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	30/09/98	21/10/98
Fine Lavori	30/09/99	28/12/99

*Villa Guastavillani***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA	
Categoria	AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)	
C.Fis./P.IVA	01131710376	
Indirizzo	VIA ZAMBONI, 33	BOLOGNA (BO)
Recapiti	Telefono: 051 6390510	Telefax: 051 359034

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	MARENO INDUSTRIE ALI VIA CONTI AGUSTI 247 MARENO DI PIAVE (TV) 00872030150	L. 152.754.000	L. 91.254.000	40,26
LICITAZIONE PRIVATA	RTI SIMON - ULTRAMOBILE VIA EMILIA 275 S. LAZZARO DI SAVENA (BO) 01772651202	L. 380.980.000	L. 225.050.000	40,93
LICITAZIONE PRIVATA	CASTELLI S.P.A. VIA OLMATELLO 21 BOLOGNA 01599091202	L. 517.000.000	L. 263.646.000	49,00
OFFERTA PREZZI	COOP. COSTRUZIONI VIA ZANARDI, 342 BOLOGNA	L. 1.051.000.000	L. 695.940.000	33,78
LICITAZIONE PRIVATA	D.P. RESTAURO snc VIA GISOLO 11 PIEVE DI CORIANO (MN) 01698840202	L. 1.525.598.800	L. 1.287.635.274	15,60
LICITAZIONE PRIVATA	CONSORZIO RAVENNATE COOP. PRODUZIONE E LAVORO VIA TEODORICO 15 RAVENNA 00080170392	L. 5.487.207.342	L. 4.311.847.529	21,42
Totali		L. 9.114.540.142	L. 6.875.372.803	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 14.898.000.000	L. 4.898.000.000	L. 0	L. 10.000.000.000	
DM 06/08/98	L. 14.898.000.000	L. 4.898.000.000	L. 0	L. 10.000.000.000	
DM 20/11/98	L. 14.898.000.000	L. 4.898.000.000	L. 0	L. 10.000.000.000	
DM 27/01/99	L. 14.898.000.000	L. 4.898.000.000	L. 0	L. 10.000.000.000	
DM 09/02/99	L. 14.898.000.000	L. 4.898.000.000	L. 0	L. 10.000.000.000	
DM 01/06/99	L. 14.898.000.000	L. 4.898.000.000	L. 0	L. 10.000.000.000	
DM 05/08/99	L. 14.898.000.000	L. 4.898.000.000	L. 0	L. 10.000.000.000	
DM 13/09/99	L. 14.898.000.000	L. 4.898.000.000	L. 0	L. 10.000.000.000	
DM 16/11/99	L. 14.898.000.000	L. 4.898.000.000	L. 0	L. 10.000.000.000	
Automatico	L. 11.535.000.000	L. 1.535.000.000	L. 0	L. 10.000.000.000	- Lit. -3363000000
DM 21/07/00	L. 11.535.000.000	L. 1.535.000.000	L. 0	L. 10.000.000.000	
DM 01/08/00	L. 11.535.000.000	L. 1.535.000.000	L. 0	L. 10.000.000.000	
DM 14/12/00	L. 11.535.000.000	L. 1.535.000.000	L. 0	L. 10.000.000.000	
DM 14/02/01	L. 11.535.000.000	L. 1.535.000.000	L. 0	L. 10.000.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (10/08/99)
Opere Civili	7.500.000.000	3.254.117.636
Opere Impiantistiche	3.300.000.000	1.057.729.893
Arredi e/o Attrezzature	500.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	11.300.000.000	4.311.847.529
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	750.000.000	567.815.882
Altre Spese Tecniche	648.000.000	300.000.000
Allacciamenti	200.000.000	618.000.000
Imprevisti	500.000.000	345.000.000
- Espropri o Acquisizioni		3.375.242
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		1.050.734.000
- Altre voci		150.000.000
IVA al 10%	1.150.000.000	431.184.753
IVA al 20%	350.000.000	539.146.800
SOMME A DISPOSIZIONE	3.598.000.000	4.005.256.677
TOTALE COSTO	14.898.000.000	8.317.104.206
	Economie	-6.580.895.794
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	4.898.000.000	815.839.934
Risorse proprie	10.000.000.000	6.450.530.272
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	14.898.000.000	7.266.370.206

Protocollo d'intervento: **6243****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE PER POTENZIARE LA RICETTIVITA' DEL LUOGO CON INTERVENTI ATTI AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE*

Comune **BOLOGNA (BO)**

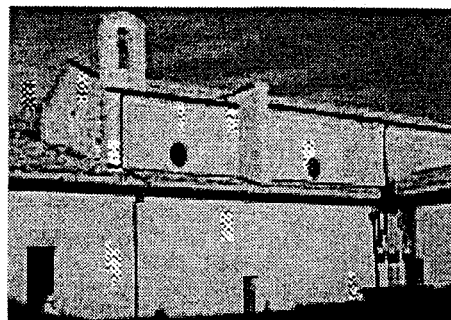
Finanziamento **L. 1.728 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 1.725.415.522**

- Tot. Pagato **L. 1.725.415.522**

Cofinanziamento **L. 205 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	24/05/99	24/05/99
Fine Lavori	28/10/99	30/12/99

*Eremo di Ronzano***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **PROVINCIA DI ROMAGNA DELL'ORDINE DEI SERVI DI MARI**

Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**

C.Fis./P.IVA **00537190373**

Indirizzo **VIA DEI BERSAGLIERI 1** **BOLOGNA (BO)**

Recapiti **Telefono: 051 226807** **Telefax: 051 226498**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	IMPRESA MELEGARI VIA BOLDRINI 25 BOLOGNA 03211590371	L. 1.419.103.822	L. 1.397.977.001	1,49
Totali		L. 1.419.103.822	L. 1.397.977.001	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

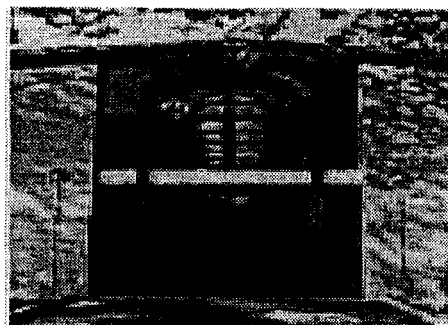
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 1.770.000.000	L. 1.570.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.770.000.000	L. 1.570.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.770.000.000	L. 1.570.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.770.000.000	L. 1.570.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.770.000.000	L. 1.570.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
Automatico	L. 1.775.923.821	L. 1.571.126.821	L. 0	L. 204.797.000	+ Lit. 5923821
DM 21/07/00	L. 1.775.923.821	L. 1.571.126.821	L. 0	L. 204.797.000	
DM 01/08/00	L. 1.775.923.821	L. 1.571.126.821	L. 0	L. 204.797.000	
DM 14/12/00	L. 1.775.923.821	L. 1.571.126.821	L. 0	L. 204.797.000	
DM 14/02/01	L. 1.932.923.821	L. 1.728.126.821	L. 0	L. 204.797.000	+ Lit. 157000000

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (24/01/01)
Opere Civili	1.120.289.482	1.209.613.081
Opere Impiantistiche	298.814.340	405.455.780
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.419.103.822	1.615.068.861
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	127.445.000	150.393.900
Altre Spese Tecniche	41.000.000	41.633.333
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	6.150.000	10.230.000
IVA al 10%	141.910.382	158.813.710
IVA al 20%	34.919.000	40.451.447
SOMME A DISPOSIZIONE	351.424.382	401.522.390
TOTALE COSTO	1.770.528.204	2.016.591.251
	Maggiore Spesa	246.063.047
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.570.000.000	1.568.415.522
Risorse proprie	200.000.000	204.797.000
Altre fonti finanziarie		243.378.729
TOTALE COPERTURE	1.770.000.000	2.016.591.251

Protocollo d'intervento: **6244****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *MAISON D'ACCUEIL DAL MONTE*Comune **BOLOGNA (BO)**Finanziamento **L. 650 milioni**- Tot. Impegnato **L. 650.000.000**- Tot. Pagato **L. 650.000.000**Cofinanziamento **L. 933 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *30/12/98* **30/12/98**Fine Lavori *30/06/99* **30/06/99***Maison d'accueil dal Monte***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **FONDAZIONE GESU' DIVINO OPERAIO**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **01064580374**Indirizzo **VIA MARCO EMILIO LEPIDO, 196****BOLOGNA (BO)**Recapiti **Telefono: 051 263515 Telefax: 051 222148****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA 17 IMPRESE	IMPRESA MARIO TAMBURINI S.P.A. VIA GRIMALDI 5 BOLOGNA 02123800373	L. 1.367.100.390	L. 1.298.745.370	5,00
Totali		L. 1.367.100.390	L. 1.298.745.370	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

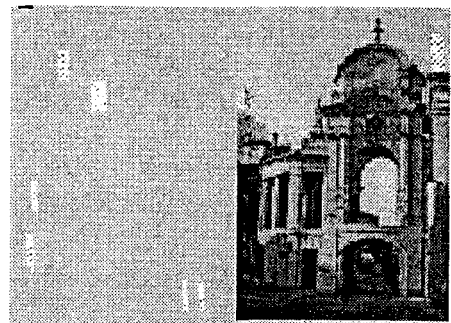
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 850.000.000	L. 650.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 06/08/98	L. 850.000.000	L. 650.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 20/11/98	L. 850.000.000	L. 650.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 27/01/99	L. 850.000.000	L. 650.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 09/02/99	L. 850.000.000	L. 650.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 01/06/99	L. 850.000.000	L. 650.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.583.000.000	L. 650.000.000	L. 0	L. 933.000.000	+ Lit. 733000000
DM 13/09/99	L. 1.583.000.000	L. 650.000.000	L. 0	L. 933.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.583.000.000	L. 650.000.000	L. 0	L. 933.000.000	
Automatico	L. 1.583.000.000	L. 650.000.000	L. 0	L. 933.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.583.000.000	L. 650.000.000	L. 0	L. 933.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.583.000.000	L. 650.000.000	L. 0	L. 933.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.583.000.000	L. 650.000.000	L. 0	L. 933.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.583.000.000	L. 650.000.000	L. 0	L. 933.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (08/05/01)
Opere Civili	433.000.000	1.507.394.703
Opere Impiantistiche	173.000.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci	23.000.000	
TOTALE LAVORI	629.000.000	1.507.394.703
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	14.000.000	27.030.000
Altre Spese Tecniche	9.000.000	
Allacciamenti	6.000.000	
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni	50.000.000	
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		240.389.868
IVA al 20%	142.000.000	5.406.000
SOMME A DISPOSIZIONE	221.000.000	272.825.868
TOTALE COSTO	850.000.000	1.780.220.571
	Maggiore Spesa	930.220.571
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	650.000.000	650.000.000
Risorse proprie	200.000.000	933.000.000
Altre fonti finanziarie		197.220.571
TOTALE COPERTURE	850.000.000	1.780.220.571

Protocollo d'intervento: **2552/b****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RESTAURO DELLA CAPPELLA DELL'ANNUNCIAZIONE (I MISTERO) E DELL'ARCO DEL MELONCELLO*
 Comune **BOLOGNA (BO)**
 Finanziamento **L. 648 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 648.100.000**
 - Tot. Pagato **L. 648.100.000**
 Cofinanziamento **L. 152 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori *08/01/99* **08/01/99**
 Fine Lavori *30/09/99* **30/09/99**

*Portico di S. Luca***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **SANT. DELLA B. V. DI SAN LUCA**
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**
 C.Fis./P.IVA **80014170379**
 Indirizzo **VIA SAN LUCA, 36** **BOLOGNA (BO)**
 Recapiti **Telefono: 051 6142339** **Telefax:**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA AD EVIDENZA PUBBLICA	DITTA TRIVELLA S.P.A. VIA GUICCIARDINI 45 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) 0402583051	L. 682.317.364	L. 570.690.243	16,36
Totali		L. 682.317.364	L. 570.690.243	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO


D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 27/01/99	L. 932.000.000	L. 782.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 09/02/99	L. 932.000.000	L. 782.000.000	L. 150.000.000	L. 0	
DM 01/06/99	L. 798.100.000	L. 648.100.000	L. 150.000.000	L. 0	Lit. -133900000
DM 05/08/99	L. 798.100.000	L. 648.100.000	L. 150.000.000	L. 0	
DM 13/09/99	L. 798.100.000	L. 648.100.000	L. 150.000.000	L. 0	
DM 16/11/99	L. 798.100.000	L. 648.100.000	L. 150.000.000	L. 0	
Automatico	L. 798.100.000	L. 648.100.000	L. 150.000.000	L. 0	
DM 21/07/00	L. 798.100.000	L. 648.100.000	L. 150.000.000	L. 0	
DM 01/08/00	L. 798.100.000	L. 648.100.000	L. 150.000.000	L. 0	
DM 14/12/00	L. 798.100.000	L. 648.100.000	L. 150.000.000	L. 0	
DM 14/02/01	L. 800.316.186	L. 648.100.000	L. 152.216.186	L. 0	Lit. 2216186

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (12/04/00)	
Opere Civili	570.690.243	680.518.593	
Opere Impiantistiche			
Arredi e/o Attrezzature			
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	570.690.243	680.518.593	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	84.000.000		
Altre Spese Tecniche	10.000.000	112.286.232	
Allacciamenti			
Imprevisti	52.075.733		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	62.539.024	7.511.361	
IVA al 20%	18.800.000		
SOMME A DISPOSIZIONE	227.414.757	119.797.593	
TOTALE COSTO	798.105.000	800.316.186	
	Maggiore Spesa		2.211.186
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	648.100.000		648.100.000
Risorse proprie	150.000.000		
Altre fonti finanziarie			152.216.186
TOTALE COPERTURE	798.100.000		800.316.186

Protocollo d'intervento: **2559/B****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELLA ROCCA VISCONTEA*Comune **CASTELL'ARQUATO (PC)**Finanziamento **L. 172 milioni**- Tot. Impegnato **L. 152.012.987**- Tot. Pagato **L. 152.012.987**Cofinanziamento **L. 140 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *24/04/99* **25/05/99**Fine Lavori *24/07/99* **29/10/99***Rocca viscontea***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI CASTELL'ARQUATO**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00230250334**Indirizzo **PIAZZA MUNICIPIO****CASTELL'ARQUATO (PC)**Recapiti **Telefono: 0523 805161****Telefax: 0523 803982****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
ASTA PUBBLICA	COOP. ARCHEOLOGICA S.C.A R.L. VIA LA VISTA, 5 - FIRENZE 03185890484	L. 233.500.000	L. 233.500.000	0,00
Totali		L. 233.500.000	L. 233.500.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 312.000.000	L. 172.000.000	L. 0	L. 140.000.000	
DM 01/06/99	L. 312.000.000	L. 172.000.000	L. 0	L. 140.000.000	
DM 05/08/99	L. 312.000.000	L. 172.000.000	L. 0	L. 140.000.000	
DM 13/09/99	L. 312.000.000	L. 172.000.000	L. 0	L. 140.000.000	
DM 16/11/99	L. 312.000.000	L. 172.000.000	L. 0	L. 140.000.000	
Automatico	L. 312.000.000	L. 172.000.000	L. 0	L. 140.000.000	
DM 21/07/00	L. 312.000.000	L. 172.000.000	L. 0	L. 140.000.000	
DM 01/08/00	L. 312.000.000	L. 172.000.000	L. 0	L. 140.000.000	
DM 14/12/00	L. 312.000.000	L. 172.000.000	L. 0	L. 140.000.000	
DM 14/02/01	L. 312.000.000	L. 172.000.000	L. 0	L. 140.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (19/02/01)
Opere Civili	233.000.000	212.730.421
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	233.000.000	212.730.421
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	13.000.000	47.393.402
Altre Spese Tecniche	31.000.000	
Allacciamenti		
Imprevisti	1.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	24.000.000	21.273.042
IVA al 20%	10.000.000	10.616.122
SOMME A DISPOSIZIONE	79.000.000	79.282.566
TOTALE COSTO	312.000.000	292.012.987
	Economie	-19.987.013
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	172.000.000	172.000.000
Risorse proprie	140.000.000	140.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	312.000.000	312.000.000

Protocollo d'intervento: **3277/A****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI PERCORSI FRA GLI 8 MONUMENTI RAVENNATI INSERITI NELLA WORLD HERITAGE DELL'UNESCO (1° LOTTO) - PERCORSO "A"</i>	
Comune	RAVENNA (RA)	
Finanziamento	L. 534 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 525.753.716
	- Tot. Pagato	L. 473.178.384
Cofinanziamento	L. 852 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<i>01/11/98</i>	07/09/98
Fine Lavori	<i>29/05/99</i>	30/11/99



Percorsi tra i monumenti ravennati inseriti nella world heritage UNSECO

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	COMUNE DI RAVENNA	
Categoria	AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)	
C.Fis./P.IVA	00354730392	
Indirizzo	PIAZZA DEL POPOLO, 1	RAVENNA (RA)
Recapiti	Telefono: 0544 482218	Telefax: 0544 482359

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
ASTA PUBBLICA	CONS. RAV. COOP. PROD.-LAV. VIA TEODORICO 15 RAVENNA 00080170392	L. 1.457.518.780	L. 1.255.652.429	13,85
Totali		L. 1.457.518.780	L. 1.255.652.429	
